반복되던 업무를 직접 만든 도구로 바꿨습니다.

AI 도구를 **도입**한 경험이 아니라, 필요한 도구를 **직접 설계하고 만들어 실제 업무에 붙인** 기록입니다. 기획 산출물을 만드는 방식과 프로젝트를 관리하는 방식, 두 구간을 바꾸고 지금도 매일 쓰고 있습니다.

최신 기술이나 성능이 가장 좋은 모델이라서 쓰는 것이 아니라, 지금 업무에 맞는 방법을 찾아 **비용 · 속도 · 품질 · 연동 공수를 따져 가장 알맞게 적용하고 확산하는 것**이 AX의 본질이라고 생각합니다.

01	**기획 산출물 자동 생성 파이프라인**	계약서를 넣으면 기능 정의 → 페이지 맵 → 동작하는 HTML 시안 → 화면별 기획서 · 테스트케이스까지 한 번에 나옵니다.
02	**PM Station**	프로젝트 관리 · 알림 · 보고 · 회의록 자동화. 마감 있는 모든 일이 한 화면에 모이고, 정해진 시각에 Teams로 먼저 알림이 갑니다.

PM Station 화면은 모두 실제 운영 중인 시스템입니다. 고객사명과 담당자명은 A사 · B사 · 홍길동 형태로 치환했습니다. **기획 산출물 자동 생성 파이프라인 산출물은 고객사 기획서를 첨부할 수 없어 가상의 예시 프로젝트로 생성한 결과물**입니다.

김석남
AI 서비스 기획 · PM

ramseok.github.io
rlatjrska1674@gmail.com

OVERVIEW

한 장 요약

두 시스템 · 문제 → 해결 → 성과

1~2주 → 1시간
기획 초안 작성
30분~1시간 내외로 단축

2개
직접 만든 시스템
설계부터 배포 · 운영까지

5개 영역
한 곳으로 통합
업무 · 알림 · 보고 · 회의록 · 문서

0건
별도 솔루션 구매
기존 AI 구독 · API로 구축

	기획 산출물 자동 생성 파이프라인 계약서 → 기획서 · 화면 시안 자동 생성 · 2026.06~	PM Station 프로젝트 관리 · 알림 · 보고 · 회의록 · 2026.08~
문제	화면을 한 장씩 그려 초안까지 1~2주 기획서 · 디자인 · 피드백 · 테스트 문서 4종으로 파편화	마감 · 회신 대기가 메신저 · 엑셀 · 메모에 흩어짐 지표 보고 · 회의록은 매번 손으로 작성 매뉴얼은 만들어도 찾아 읽지 않음
해결	계약서를 넣으면 시안 · 기획서 · 테스트케이스 일괄 생성 화면 단위로 묶어 링크 하나로 고객사에 공유	흩어진 업무는 **한 화면 + Teams 알림**으로 지표 보고 · 회의록은 **자동 생성**으로 매뉴얼은 **사내 지식 검색(챗봇)**으로
적용	개인을 넘어 **사내 기획 방식**을 이 기준으로 재정립	**개인 PM 업무**에 적용해 효율을 끌어냄
성과	초안 작성 **1~2주 → 30분~1시간** 흩어진 문서 **4종 → 링크 1개** 고객 검토 · 요구사항 조율 시간 대폭 단축	업무 확인 경로 **4곳 → 1곳** 지표 보고 **매일 30분 → 자동** 회의록 **15~20분 → 초안 1분 내외** 매뉴얼 조회 **10초 이내**

공통 기준

따로 찾아 들어가야 하는 도구는 결국 안 쓰게 됩니다.

그래서 알림은 정해진 시간에 Teams로 먼저 보내고, 보고서와 기획서는 평소 보던 화면에서 바로 볼 수 있게 했습니다.

CONTENTS


03 — 08
기획 산출물 자동 생성 파이프라인
시안 허브 · 화면별 기획서 · 테스트케이스 · 고객사 코멘트 · 관리자 시안 · 디자인 가이드

09 — 17
PM Station
대시보드 · WBS · 알림 · 운영 보고서 · AI 회의록 · 사내 지식 검색 · 변경 이력

18
마무리
일하는 방식과 입사 후 계획

01 기획 산출물 자동 생성 파이프라인

계약서 PDF 한 건을 넣으면 기능 정의부터 **클릭이 되는 HTML 시안 · 화면별 기획서 · 테스트케이스 · 고객사 코멘트 영역**까지 한 번에 만들어 링크로 전달합니다. 개인 도구에서 시작해, **사내 기획 방식 자체를 이 기준으로 재정립**했습니다.

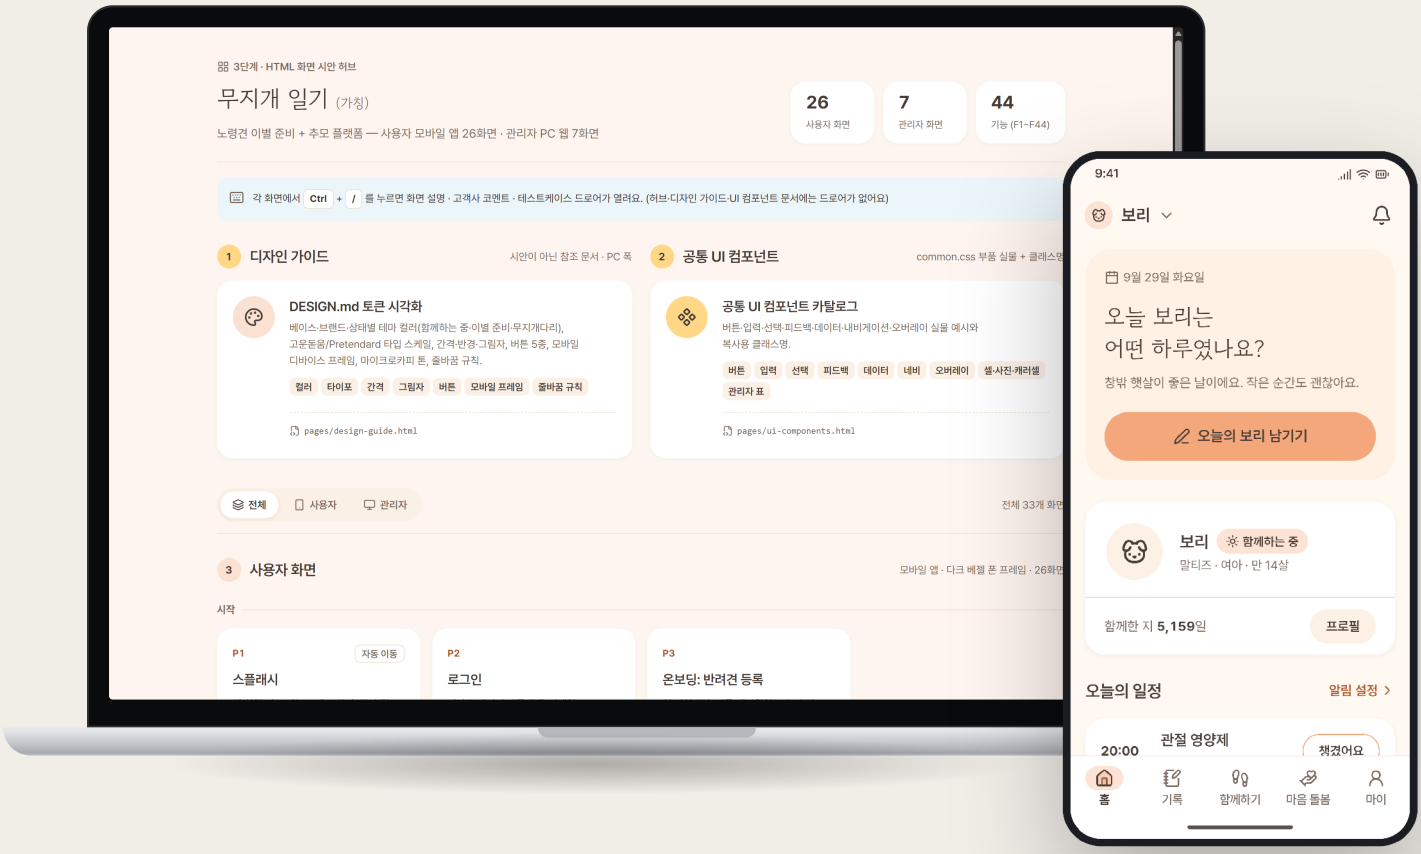

시안 허브 · 사용자 화면 — 가상 예시 프로젝트 「무지개 일기」로 생성한 결과물입니다. 전체 화면과 화면별 기획서는 ramseok.github.io/prd-demo 에서 볼 수 있습니다.

1~2주 → 1시간
착수 기획 초안 작성
30분~1시간 내외로 단축

4종 → 1곳
기획서 · 디자인 가이드
피드백 · 테스트케이스 통합

직접 클릭 검토
고객사가 기획서를 펼친 채
화면을 직접 눌러 확인

HTML · CSS 인계
실제 마크업 위에서
개발 착수

ROLE
설계 · 구축 · 운영

PERIOD
2026.06 — 운영 중

STACK
Claude Code · 에이전트 9종
Supabase · Netlify · Vercel

기획 산출물 자동 생성 파이프라인

문제

- Figma로 화면을 한 장씩 그려 **초안까지 1~2주**
- 1명이 여러 프로젝트를 병렬로 맡는 구조라 기획에 일정 · 공수가 몰려 **전체 일정의 병목** 발생
- 기획서 · 디자인 가이드 · 고객 피드백 · 테스트케이스가 **서로 다른 문서로 파편화**
- 피드백이 어느 화면 · 어느 항목 얘기인지 **매번 다시 대조**

해결

계약서 PDF를 출발점으로 기능 정의 → 페이지 맵 → HTML 시안 → 화면별 기획서 · 테스트케이스까지 한 번에 생성

- **동작하는 HTML 시안** — 버튼 클릭 · 페이지 이동이 실제로 되는 화면
- **리뷰 레이어** — **Ctrl + /** 로 화면별 기획서 · 고객 코멘트 · 테스트케이스를 한 패널에
- **디자인 · 컴포넌트 가이드** — DESIGN.md 토큰으로 전 화면 통일
- **품질 게이트** — 생성과 검토를 분리, 내용 기준으로 완료 판정
- **링크 전달** — 자동 배포 후 링크 하나로 공유, 피드백은 DB에 기록

성과

- **개인 도구 → 사내 기획 방식** — 개인 업무를 넘어, 사내 기획 산출물을 이 파이프라인 기준으로 만들도록 재정립
- **파편화된 문서 4종 → 링크 1개** — 기획 · 디자인 · 피드백 · 테스트를 한 곳에서 진행
- **고객사 만족도 상승** — 직접 버튼을 누르고 페이지를 이동하며 기획서와 함께 검토
- **HTML · CSS 인계** — 개발팀이 실제 마크업 위에서 바로 착수
- **초안 작성 1~2주 → 30분~1시간** — 최초 산출물 기준

이전 → 이후

구간	이전	지금
초안 작성	Figma로 화면을 한 장씩 작도 · 1~2주	**30분~1시간** 내외로 일괄 생성
고객 전달	PDF 변환 · 병합 후 첨부	자동 배포된 **링크 하나**
피드백	메신저 · 메일 · 별도 문서로 분산	화면에 붙어 **상태로 관리**
검수	테스트케이스를 별도 문서로 관리	시안 안에서 **Pass · Fail 기록**

계약서 한 건에서 나온 결과물

01 계약서 입력 | 02 기능 정의 | 03 페이지 맵 | 04 HTML 시안 | 05 기획서 · TC | 06 링크 배포

전체 기획서 바로 보기 — 가상 예시 프로젝트 「무지개 일기(가칭)」

시안 허브 · 화면별 기획서 ramseok.github.io/prd-demo

실제 고객사 기획서는 비밀유지 대상이라 첨부할 수 없어, 이 장의 산출물은 모두 **가상의 예시 프로젝트로 생성한 결과물**입니다(특정 고객사 내용 아님). 아래는 위 흐름의 04~05단계 산출물이며, 화면 확인용 정적 HTML이라 **실제 서버 배포와 DB 연동은 되어 있지 않아** 로그인 · 저장은 동작하지 않고 코멘트 · 테스트케이스 결과는 보고 있는 브라우저에만 임시로 남습니다. 시안 화면에서 **Ctrl + /** 를 누르면 그 화면의 기획서가 열립니다.



산출물 — **시안 허브** — 예시 프로젝트 한 건에서 **사용자 화면 26 · 관리자 화면 7 · 기능 44개(F1~F44)**가 생성됐습니다. 화면 카드마다 설명과 관련 기능 번호, 실제 파일 경로가 함께 붙어 **기능과 화면이 1:1로 대응**됩니다. 상단 안내처럼 모든 화면에서 **Ctrl + /** 로 리뷰 패널이 열립니다.

좋은 모델을 한꺼번에 쓰지 않고, 일의 무게에 맞는 모델을 단계마다 나눠 배치했습니다.

CLAUDE OPUS

판단이 무거운 일

계약서 해석 · 기능 정의
디자인 기반 · 품질 검토

정확도 우선

CLAUDE SONNET

반복해서 만드는 일

페이지 맵 · HTML 화면 양산
화면별 기획서 · 문서 정리

품질 · 속도 · 비용 균형

CLAUDE HAIKU


기계적으로 확인하는 일

규칙 위반 · 누락 검사
(검토 전 1차 필터)

속도 · 비용 우선

전담 에이전트 9종이 이 배치로 분업하고, 상위 산출물이 바뀌면 하위 단계의 검토 상태가 자동으로 풀려 문서끼리 어긋나지 않습니다.


화면을 보면서 그 화면의 기획서를

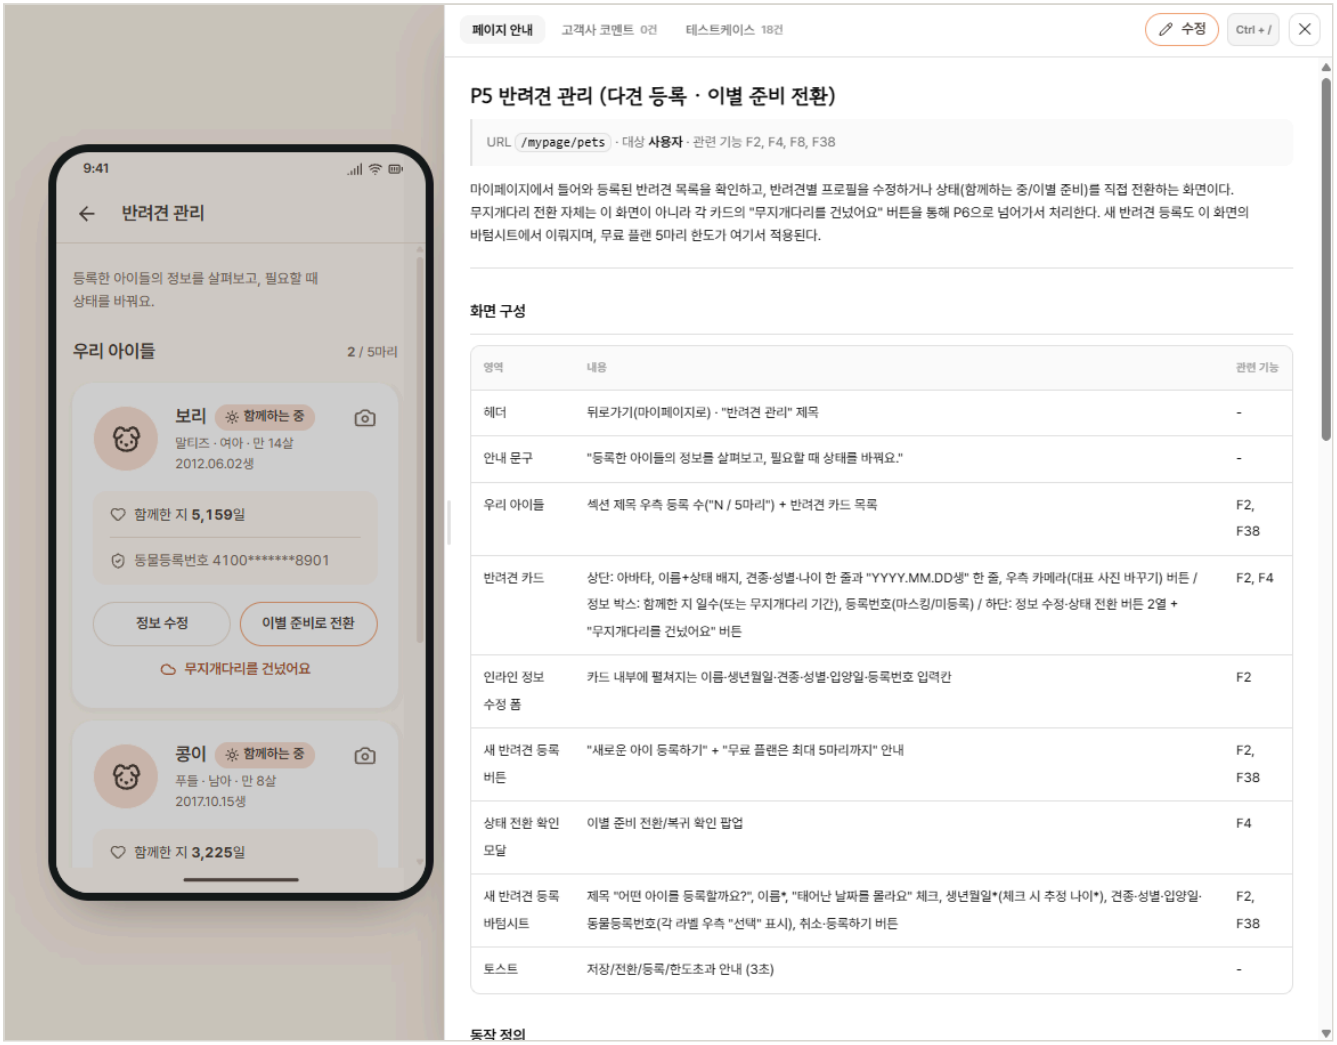


산출물 — **화면별 기획서** — 왼쪽은 클릭과 페이지 이동이 실제로 동작하는 시안, 오른쪽은 **Ctrl + /** 로 열리는 패널입니다. URL · 대상 · 관련 기능이 머리에 오고, 화면 구성은 **영역 · 내용 · 관련 기능** 표로 정리됩니다. 개발팀이 그대로 읽는 문서입니다.

기획서와 시안을 따로 보내면 고객사는 두 문서를 번갈아 맞춰 봐야 했습니다. 지금은 **보고 있는 화면이 곧 문서의 기준점**이라, "어느 화면의 어느 항목"을 설명하는 데 드는 대화가 사라졌습니다.

검수와 피드백을 도구 안으로

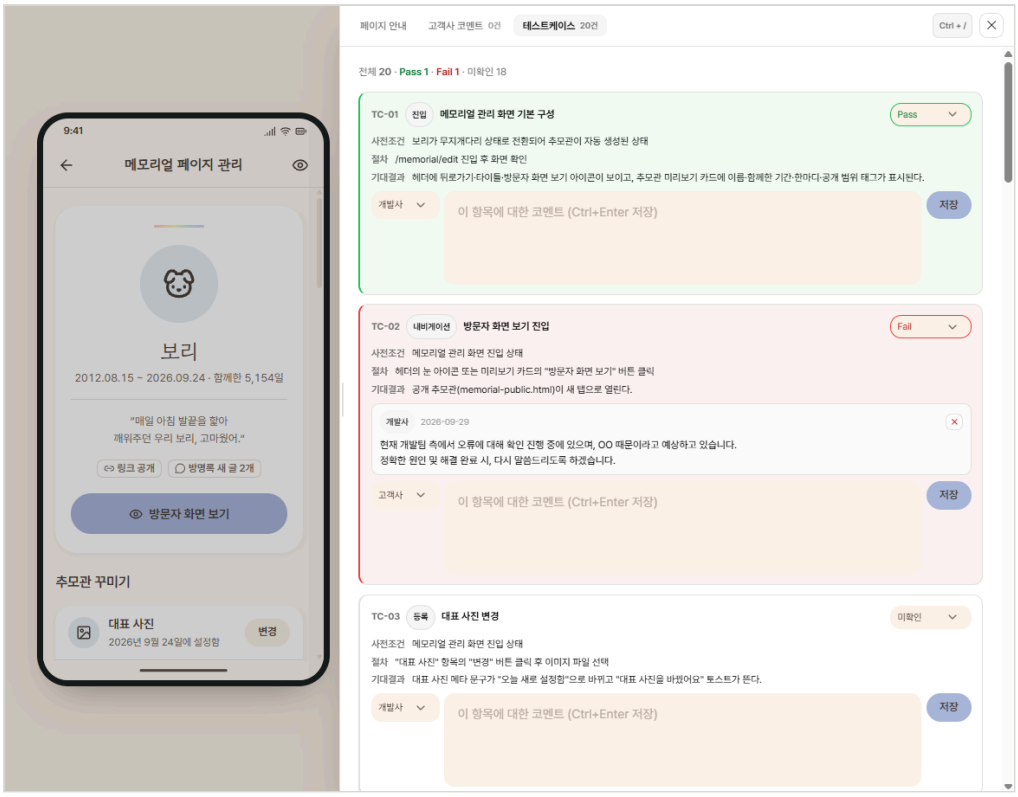


산출물 — **테스트케이스** — 사전조건 · 절차 · 기대결과가 화면 단위로 붙고 **Pass · Fail · 미확인** 상태를 그 자리에서 바꿉니다. Fail 항목에는 개발사와 고객사가 각각 코멘트를 남깁니다.

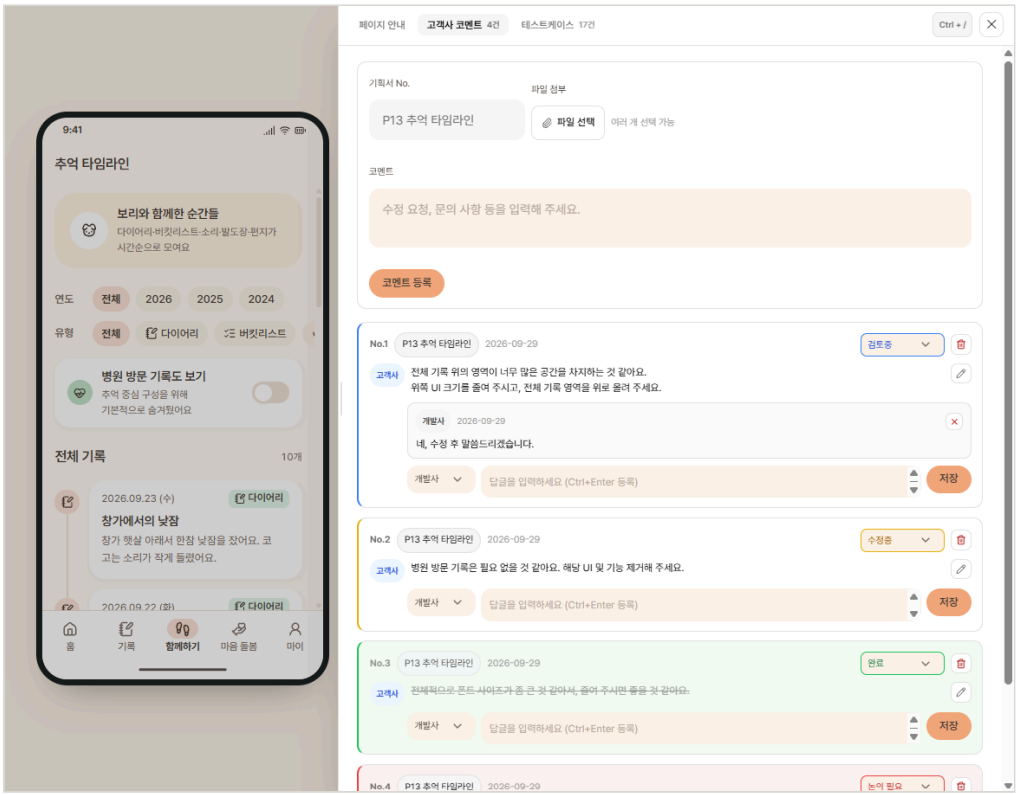

산출물 — **고객사 코멘트** — 고객사가 화면을 보면서 바로 수정 요청을 남기고 개발사가 답글을 답니다. 각 건은 **검토중 · 수정중 · 완료 · 논의 필요**로 관리되고 파일도 첨부됩니다.

운영 화면과 디자인 기준까지

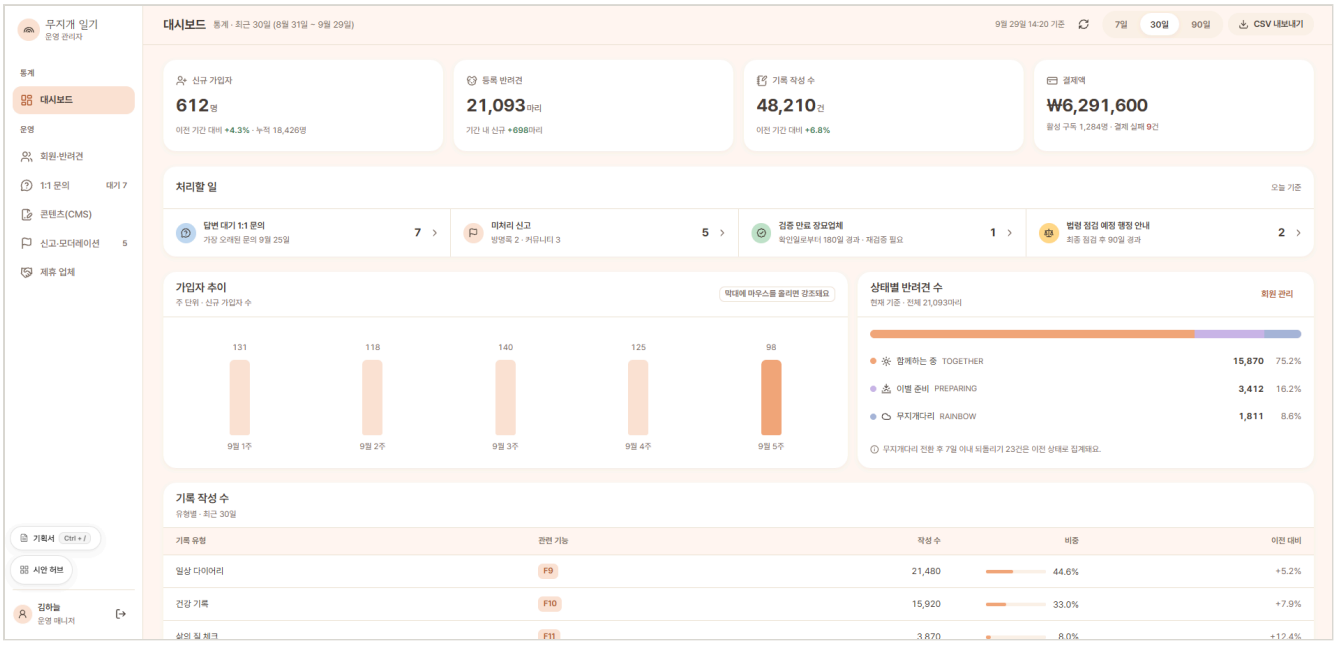


산출물 — **관리자 대시보드 시안** — 사용자 화면뿐 아니라 운영자가 보는 화면까지 생성됩니다. 지표 카드 · 처리할 일 · 추이 그래프 · 상태별 분포를 구성해 **운영자가 무엇을 보고 무엇을 처리하는지**를 화면으로 합의합니다. (표시된 수치는 예시값)



산출물 — **디자인 가이드** — 고객사 디자인 요구사항과 레퍼런스를 **DESIGN.md**의 토큰으로 정리하고, 그 값이 화면에 실제로 어떻게 적용되는지 실물로 보여주는 문서입니다. 콘셉트 · 컬러 · 타이포 · 버튼 · 접근성 · 금지 사항까지 11개 절로 고정해 **주관적 피드백으로 되돌아가는 재작업**을 줄입니다.

02 PM Station

흩어져 있던 마감 · 회신 대기 · 정기 업무를 한 화면에 모으고, **챙겨야 할 일을 정해진 시간에 먼저 알려 주는** 업무 시스템으로, **제 PM 업무에 적용**해 효율을 끌어냈습니다.

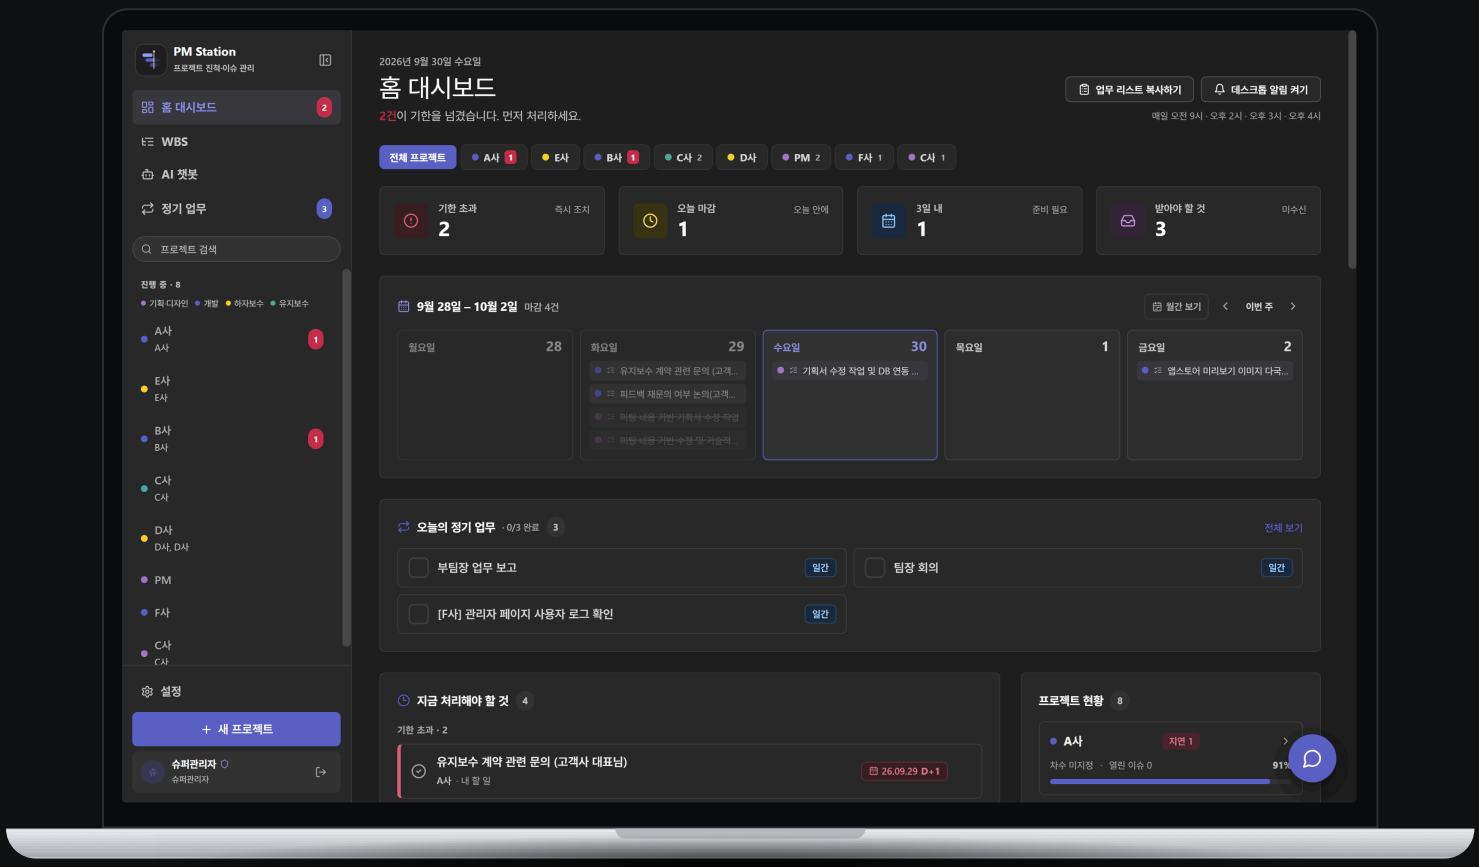

홈 대시보드 — 실제 운영 중인 화면입니다. 기한 초과 · 오늘 마감 · 3일 내 · 받아야 할 것으로 자동 분류되고, 고객사명은 A사 · B사로 치환했습니다.

4곳 → 1곳
업무 확인 경로
메신저 · 엑셀 · 메모 · 문서

매일 08:10
운영 보고서 자동 발행
지표 12개 · 조치 필요 · PDF

20분 → 1분
회의록 1건 작성 (15~20분 → 초안 1분 내외)
녹음 · 텍스트로 초안 자동 생성

ROLE
기획 · 설계 · 검증 · 운영
(구현은 AI 개발 도구 활용)

PERIOD
2026.08 — 운영 중

STACK
React · Supabase · Vercel
OpenAI · Microsoft Teams

문제

- 매뉴얼을 문서로 쌓아도 필요한 순간에 **아무도 열어보지 않음**
- 마감 · 고객사 회신 대기가 메신저 · 엑셀 · 개인 메모에 흩어져 **누락 위험**
- 운영 지표는 매일 아침 관리자 페이지를 눌러 확인한 뒤 **구두로 보고**
- 회의록은 매번 직접 정리 — **1건에 15~20분**

해결


PM 업무 전체를 한 서비스로 재설계, **Claude Code로 직접 구축**

- **업무 관리** — 마감 항목을 기한 초과 · 오늘 · 3일 내 · 받아야 할 것으로 자동 분류, WBS 일정 관리
- **알림** — 설정한 시각마다 담당 업무를 서버가 Teams로 자동 발송
- **정기 업무** — 일 · 주 · 월 주기 업무의 연속 달성 · 누락 추적
- **보고 자동화** — 자사 서비스의 어드민 데이터를 읽어 매일 운영 보고서 · PDF 자동 발행
- **AI 회의록** — 논의 · 결정 · 후속 조치 · 확인 필요로 정리, 원문 키워드 검색
- **사내 지식 검색** — 워드 매뉴얼을 md로 변환해 챗봇 학습 데이터로, 질문하면 근거 문서와 함께 답변 · 필요하면 실시간 웹 검색 선택
- **변경 이력** — 등록 · 변경 · 삭제를 DB 트리거로 자동 기록
- **계정 · 권한** — 개인 업무에 먼저 써 보며 효과를 확인한 뒤, 팀 내 공유를 대비해 가입 승인 · 프로젝트 참여 신청 · 담당 범위 권한을 미리 구축 (팀원 적용 전)


성과

- **지표 보고 매일 약 30분 → 0분** — 매일 08:10 자동 발행, 월 약 10시간 절감 (검수 시간 제외)
- **회의록 작성 15~20분 → 초안 1분 내외** — 녹음 · 텍스트를 넣으면 초안 완성, 확인 후 저장
- **업무 확인 경로 4곳(메신저 · 엑셀 · 개인 메모 · 매뉴얼 문서) → 1곳** — 진행 중인 모든 프로젝트를 한 화면에서
- **알림 시각 복수 선택** — 원하는 시각을 골라 두면 그 시각마다 담당 업무 자동 발송
- **사내 지식 검색 솔루션 구축 · 운영 — 매뉴얼 조회 10초 이내** — Teams → 채널 → 파일 → 워드 문서를 열어 찾던 매뉴얼을, 질문 한 번으로 바로 답변

흩어진 일을 한 화면으로

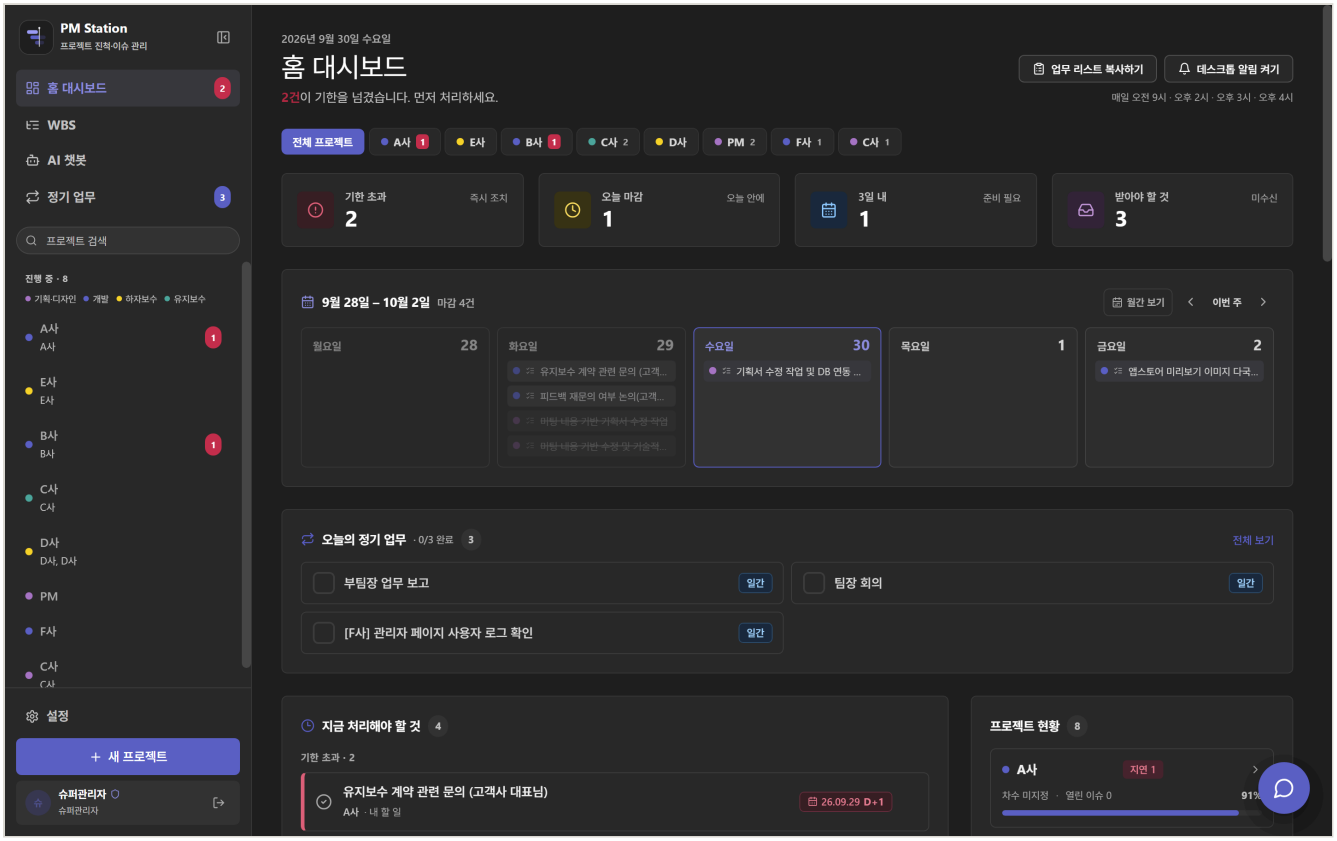


전체 화면 — **홈 대시보드** — 왼쪽에 진행 중인 프로젝트 8건, 가운데에 이번 주 마감과 오늘의 정기 업무, 아래에 지금 처리해야 할 항목이 놓입니다. 고객사명은 A사 · B사로 치환했습니다.

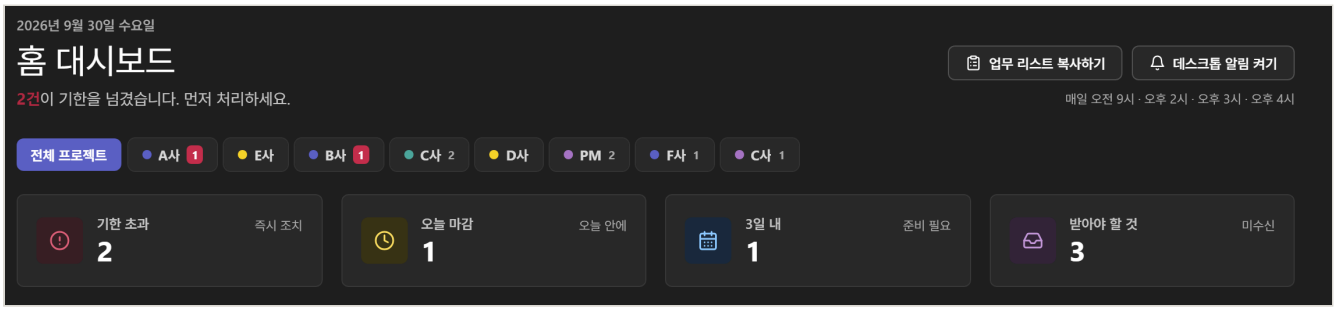


확대 — **네 갈래 분류와 알림 시각** — 마감이 있는 항목은 **기한 초과 · 오늘 마감 · 3일 내 · 받아야 할 것**으로 자동 분류됩니다. 오른쪽 위 버튼 아래의 **"매일 오전 9시 · 오후 2시 · 오후 3시 · 오후 4시"**가 Teams로 알림이 나가는 시각입니다.

- **받아야 할 것** — 내 할 일이 아니라 고객사 회신 · 자료를 기다리는 항목을 별도 갈래로 분리
- **오늘의 정기 업무** — 일 · 주 · 월 주기 업무를 대시보드에서 바로 체크, 연속 달성 · 누락 추적

누가 언제 무엇을 끝내는지

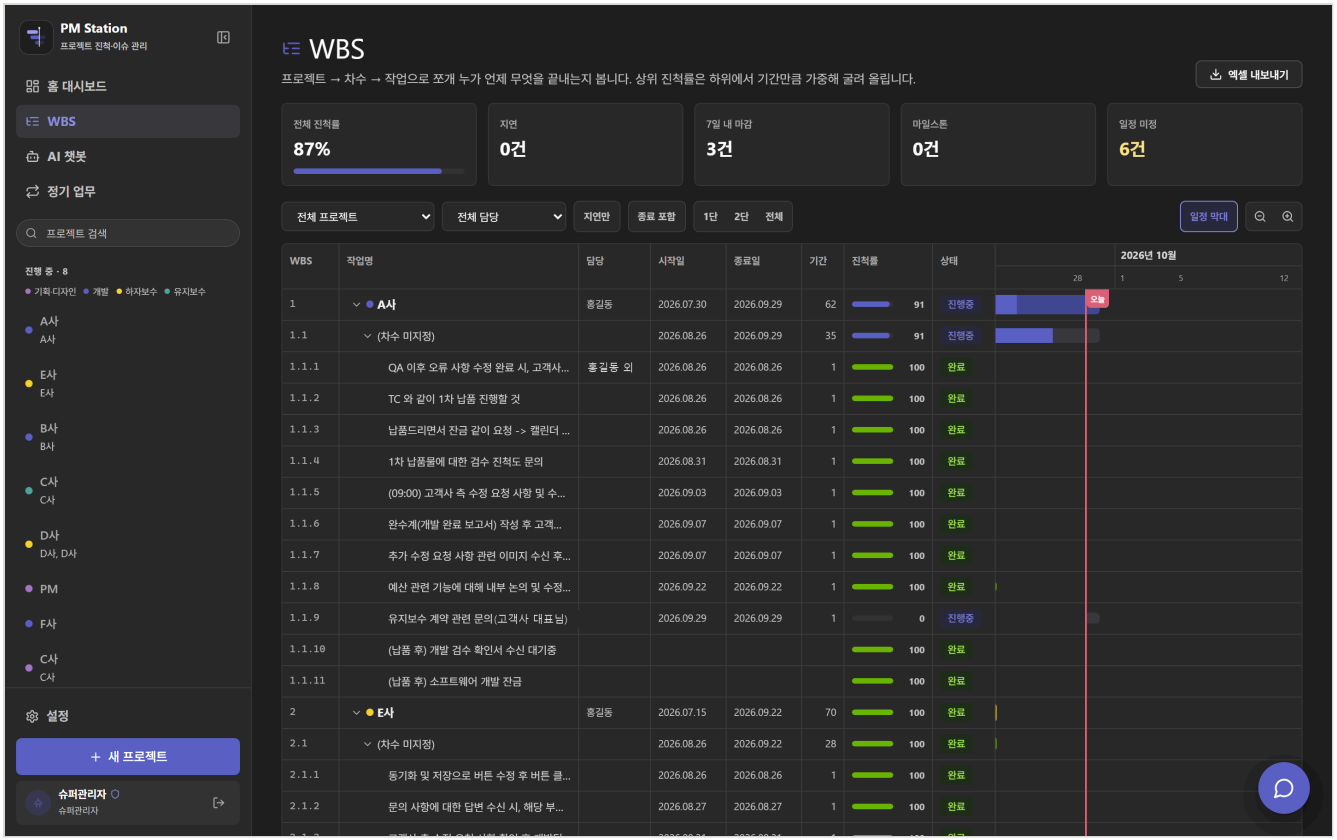


전체 화면 — **WBS · 간트** — 프로젝트 → 차수 → 작업으로 쪼개고, 상위 진척률은 하위 작업에서 기간만큼 가중해 굴려 올립니다. 전체 진척률 · 지연 · 7일 내 마감 · 마일스톤 · 일정 미정을 상단에 두어, 여러 프로젝트의 일정 충돌을 먼저 보게 했습니다.

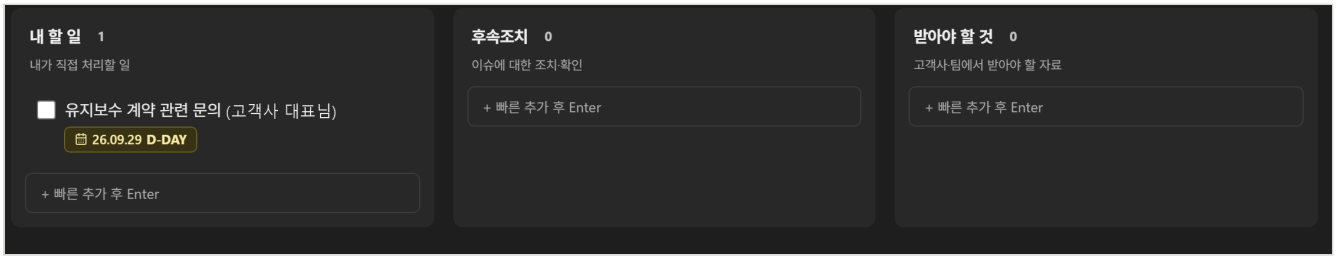


확대 — **프로젝트 상세의 세 레인** — 할 일을 **내가 직접 처리할 일 / 이슈에 대한 후속조치 / 고객사 · 팀에서 받아야 할 자료**로 분리했습니다. "받아야 할 것"을 별도 레인으로 세워 두지 않으면 대기 중인 건이 반드시 새기 때문입니다.

앱을 열지 않아도 할 일이 먼저 옵니다

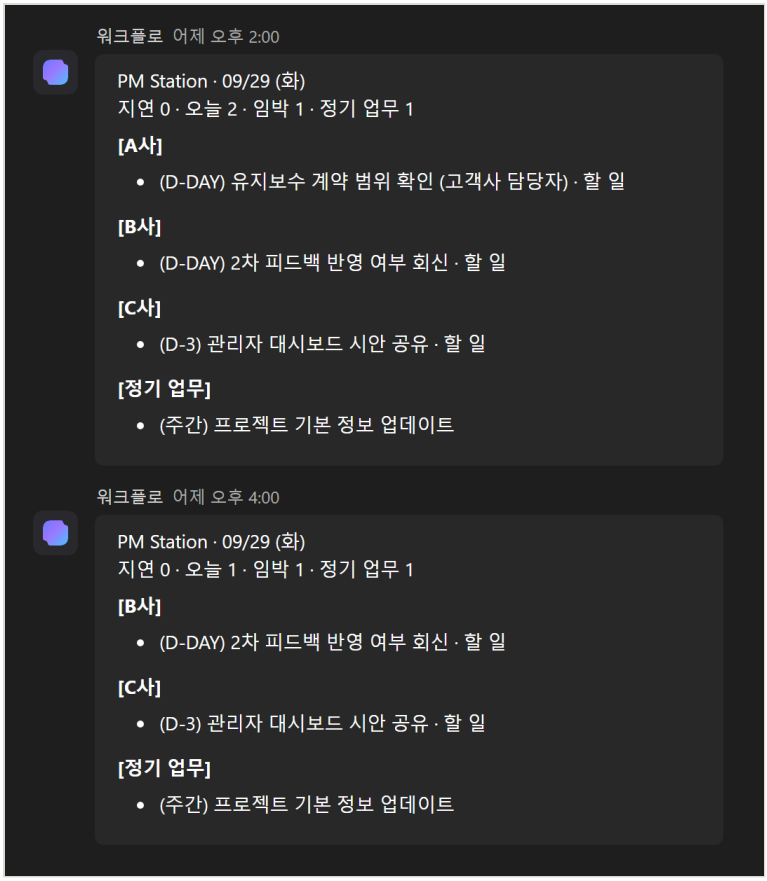

수신 — **Teams 개인 채팅** — 설정한 시각마다 담당 프로젝트별 업무가 지연 · 오늘 · 임박 · 정기 업무 순으로 도착. 이미 끝낸 일은 다음 알림에서 빠짐 (내용은 가상 예시)



설정 — **알림 시각 복수 선택** — 원하는 시각을 여러 개 고르면 브라우저 · Teams 알림에 함께 적용




연동 — **채널 주소 등록** — 한 번 등록하면 서버가 보내므로 앱을 꺼 둬도 도착

- **원하는 시각을 복수로 선택** — 설정한 시각마다 자동 발송
- **담당 프로젝트 업무만** — 참여 승인된 프로젝트 기준으로 범위를 나눔
- **열지 않아도 도착** — 대시보드는 열어야 보이지만, 알림은 평소 쓰는 Teams로 바로 도착

동작 흐름


01	02	03	04	05
알림 시각 복수 선택	서버 스케줄러가 시각마다 실행	담당 프로젝트의 미완료 업무 집계	Teams 개인 채팅으로 발송	끝낸 일은 다음 알림에서 제외

매일 아침의 구두 보고를 없앤 자리

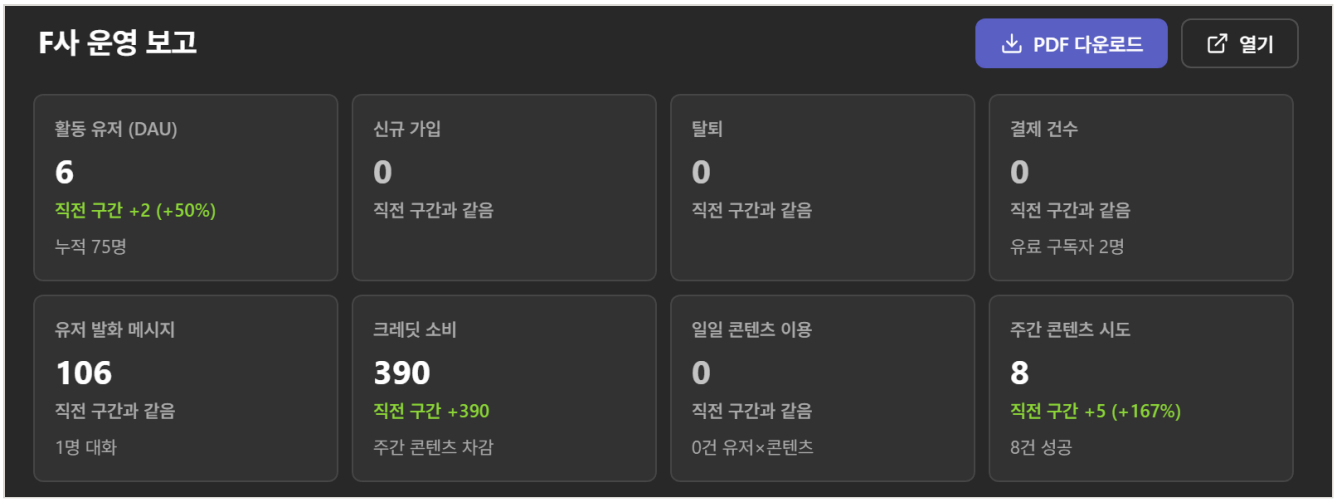


지표 · PDF — **지표 12개와 증감 · PDF 다운로드** — 직전 보고서 이후 구간을 같은 길이의 직전 구간과 비교해 증감을 함께 표시하고, 보고서마다 PDF로 바로 받음

- **매일 08:10 자동 발행** — 서버가 자사 서비스의 어드민 데이터를 읽어 보고서와 PDF를 만들어 기록 탭에 쌓음
- **매일 약 30분 → 0분** (검수 시간 제외) — 사용자 이름 · 아이디는 유저 A~K, 서비스명은 F사로 치환해 촬영

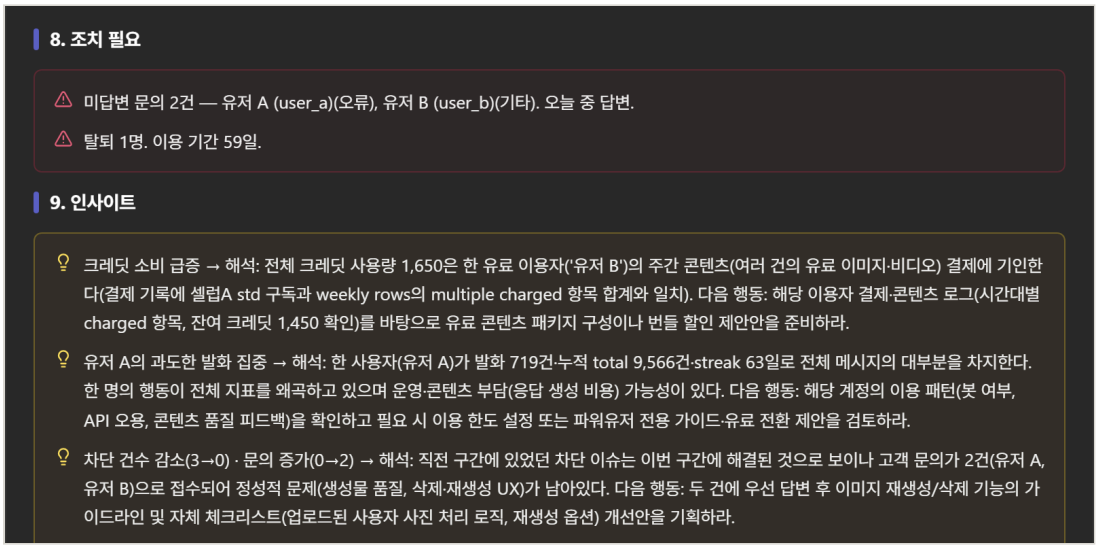


조치 · 인사이트 — **오늘 할 일과 해석** — 당일 처리할 항목을 먼저 띄우고, 지표마다 "해석 → 다음 행동"을 붙임




장애 내성 — **일부 수집 실패 표시** — 어드민 API 한 곳이 실패해도 보고서는 멈추지 않고 빈 항목과 확인할 곳을 적어 둠

회의가 끝나면 초안이 먼저 있습니다

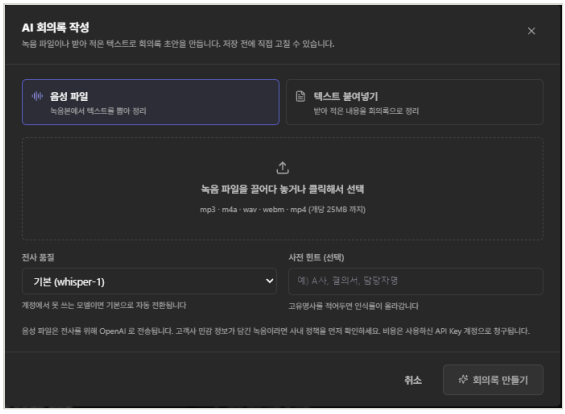

입력 — **녹음 파일 또는 텍스트** — mp3 · m4a · wav 등 녹음본이나 받아 적은 메모 · 문서를 그대로 넣음

- 결과는 **논의 내용 · 결정 사항 · 후속 조치 · 확인 필요**로 나누어 작성
- **원문을 함께 저장**하고, 원문 안에서 **키워드 검색** → 해당 줄로 바로 이동
- 녹취에 없는 내용은 쓰지 않도록 규칙화 — 초안과 원문을 대조해 확인
- **회의록 작성 15~20분 → 초안 1분 내외** (예시는 가상의 회의 내용으로 생성)

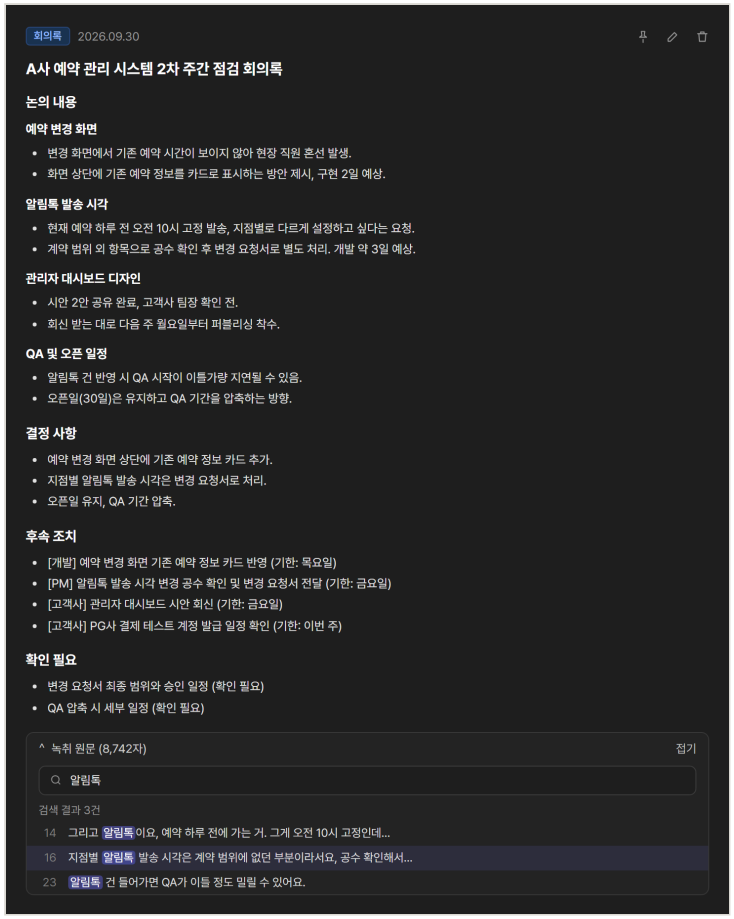

결과 — **생성된 회의록** — 논의 내용 · 결정 사항 · 후속 조치 · 확인 필요로 구분, 아래에 원문과 키워드 검색 (내용은 가상 예시)

동작 흐름

01
녹음 파일 또는 텍스트 · 문서 입력


02
음성은 전사 (Whisper)

03
논의 · 결정 · 후속 조치 · 확인 필요로 정리


04
저장 전 직접 수정

05
원문 보관 · 키워드 검색

매뉴얼을 찾지 않고 물어봅니다

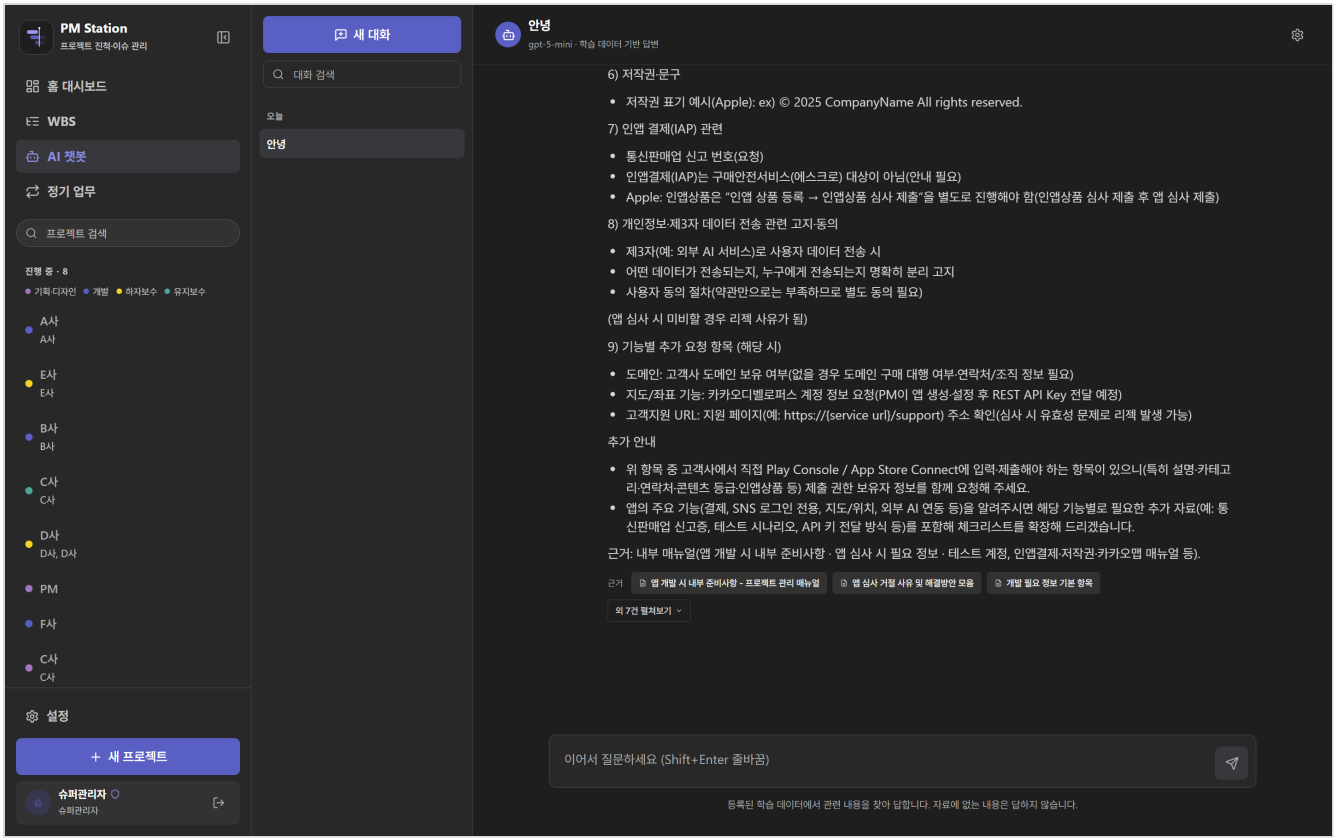


전체 화면 — **사내 지식 검색** — 워드로 흩어져 있던 사내 매뉴얼을 md 파일로 변환해 학습 데이터로 올리고, 앱 심사 준비물이나 세금계산서 양식 같은 질문에 항목별로 정리해 답합니다. 과도기에 Claude AI의 'PM' 프로젝트로 쓰던 문서 검색 방식을 시스템 안의 기능으로 흡수한 부분입니다.



확대 — **근거 문서 표시** — 답변 아래에 **어느 매뉴얼에서 나온 내용인지** 근거 문서를 붙여 보여줍니다. 화면 맨 아래 안내처럼 **등록된 학습 데이터에 없는 내용은 답하지 않도록** 제한해, 업무에 쓸 수 없는 그럴듯한 답을 막았습니다. 외부 정보도 함께 보고 싶을 때는 설정에서 **실시간 웹 검색**을 켤 수 있게 선택지를 두었습니다.

누가 언제 무엇을 바꿨는지

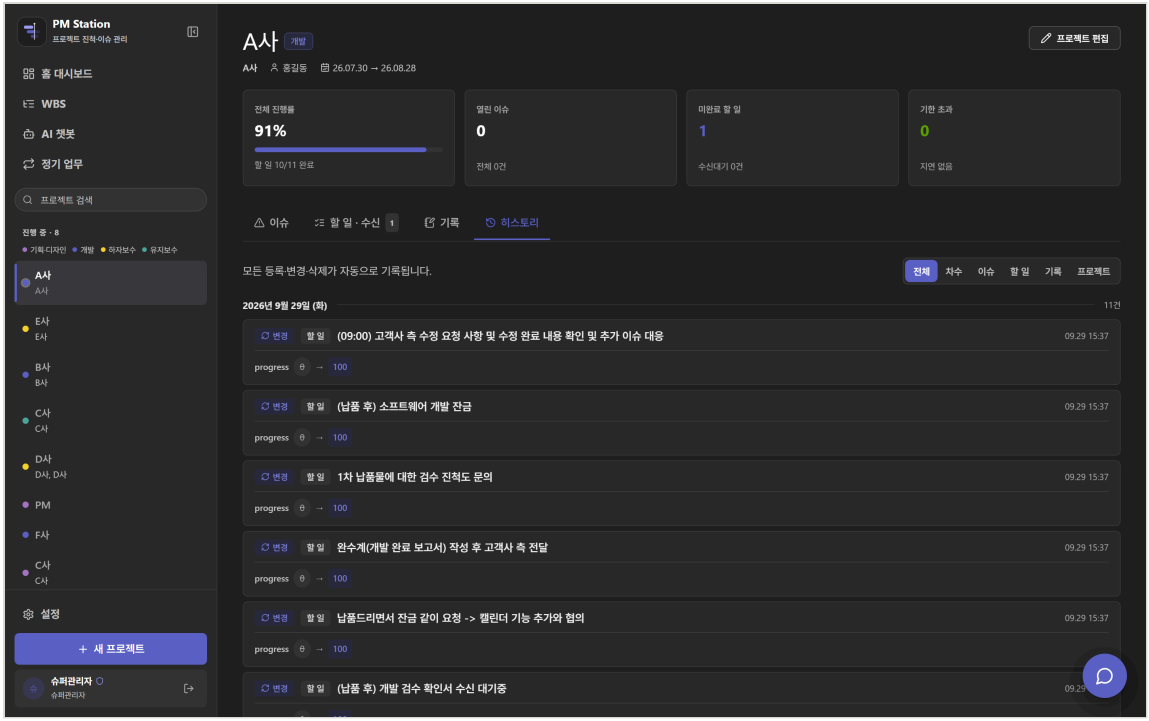

전체 화면 — **변경 이력** — 등록 · 변경 · 삭제가 DB 트리거로 자동 기록됩니다. 어떤 할 일의 진척률이 언제 0에서 100으로 바뀌었는지까지 남아, "그때 일정이 왜 바뀌었죠?"에 근거로 답할 수 있습니다. 차수 · 이슈 · 할 일 · 기록 · 프로젝트별로 걸러 봅니다.



확대 — **변경 목록** — 항목마다 무엇이 어떤 값에서 어떤 값으로 바뀌었는지(예: progress 0 → 100)와 시각이 남습니다. 오른쪽 위에서 차수 · 이슈 · 할 일 · 기록 · 프로젝트별로 거를 수 있습니다.

무엇이 남는가

- **누가 · 언제 · 무엇을** — 할 일 · 이슈 · 차수 · 기록 · 프로젝트의 등록 · 변경 · 삭제가 사람이 따로 적지 않아도 남습니다.
- **바뀌기 전과 후** — 진척률 · 기한 · 담당자처럼 바뀐 항목은 이전 값과 이후 값을 함께 보여 줍니다.
- **보고의 근거** — 일정이 밀린 이유를 기억이 아니라 기록으로 설명할 수 있고, 고객사와 범위를 다툴 때도 근거가 됩니다.

공수가 드는 반복 업무는 시스템이 맡고, 사람은 사람만 할 수 있는 일에 집중하게 만들겠습니다.

도메인이 전혀 다른 수많은 고객사의 SI 프로젝트에서 늘 **그들이 어떻게 일하는지, 어떤 불편함을 겪고 있는지부터** 파악해 왔습니다. 새로운 조직에서도 먼저 현업을 보고, 시간과 손이 가장 많이 드는 반복 작업부터 걷어내 **업무 효율을 끌어올리겠습니다.**

01	02	03	04	05
어떻게 일하는지 파악	공수가 새는 지점 발견	효과 순으로 우선순위	동작하는 도구로 자동화	성과를 측정해 지속 개선 · 확대 적용

Thank you.

김석남

AI 서비스 기획 · PM

ramseok.github.io · rlatjrska1674@gmail.com
