

반복되던 업무를 직접 만든 도구로 바꿨습니다.

AI 도구를 도입한 경험이 아니라, 필요한 도구를 직접 설계하고 만들어 팀에 붙인 기록입니다. 기획 산출물을 만드는 방식과 프로젝트를 관리하는 방식, 두 구간을 바꾸고 지금도 매일 쓰고 있습니다.

01 PM Station

프로젝트 관리 · 알림 · 보고 · 회의록 자동화. 마감 있는 모든 일이 한 화면에 모이고, 정해진 시각에 Teams로 먼저 알림이 갑니다.

02 PRD Toolkit

계약서를 넣으면 기능 정의 → 페이지 맵 → 동작하는 HTML 시안 → 화면별 기획서 · 테스트케이스까지 한 번에 나옵니다.

PM Station 화면은 모두 실제 운영 중인 시스템입니다. 고객사명과 담당자명은 A사 · B사 · 홍길동 형태로 치환했습니다. PRD Toolkit 산출물은 고객사 기획서를 첨부할 수 없어 가상의 예시 프로젝트로 생성한 결과물입니다.

김석남

AI 서비스 기획 · PM

ramseok.github.io
rlatjrsk1674@gmail.com

1~2주 → 1시간

기획 초안 작성

30분~1시간 내외로 단축

2개

직접 만든 시스템

설계부터 배포 · 운영까지

5개 영역

한 곳으로 통합

업무 · 알림 · 보고 · 회의록 · 문서

0건

별도 솔루션 구매

기존 AI 구독 · API로 구축

PM Station

프로젝트 관리 · 알림 · 보고 · 회의록 · 2026.08~

문제

매뉴얼은 안 읽히고, 마감 · 회신 대기는 메신저 · 엑셀 · 메모에 흩어짐

해결

PM 업무 전체를 한 서비스로 재설계, Claude Code로 직접 구축

성과

지표 보고 **매일 30분 → 자동**
회의록 **15~20분 → 1분 내외**

PRD Toolkit

계약서 → 기획서 · 화면 시안 자동 생성 · 2026.06~

화면을 한 장씩 그려 초안까지 1~2주, 관련 문서는 4종으로 파편화

계약서를 넣으면 시안 · 기획서 · 테스트케이스까지 한번에 생성

흩어진 문서 **4종 → 링크 1개**
고객 검토 · 요구사항 조율 시간 대폭 단축

공통 기준

**사람이 도구 앞으로 가지 않아도,
도구가 먼저 사람에게 가도록.**

알림은 서버가 먼저 보내고, 보고서와 기획서는 사용자가 이미 보고 있는 자리에 놓이게 했습니다.

CONTENTS

03 — 11

PM Station

대시보드 · WBS · 알림 · 운영 보고서 · AI 회의록 · 챗봇 · 변경 이력

12 — 17

PRD Toolkit

시안 허브 · 화면별 기획서 · 테스트케이스 · 고객사 코멘트 · 관리자 시안 · 디자인 가이드


18

마무리

일하는 방식과 입사 후 계획

01 PM Station

흩어져 있던 마감·회신 대기·정기 업무를 한 화면에 모으고, 사람이 챙기기 전에 도구가 먼저 알려 주는 사내 업무 시스템입니다.

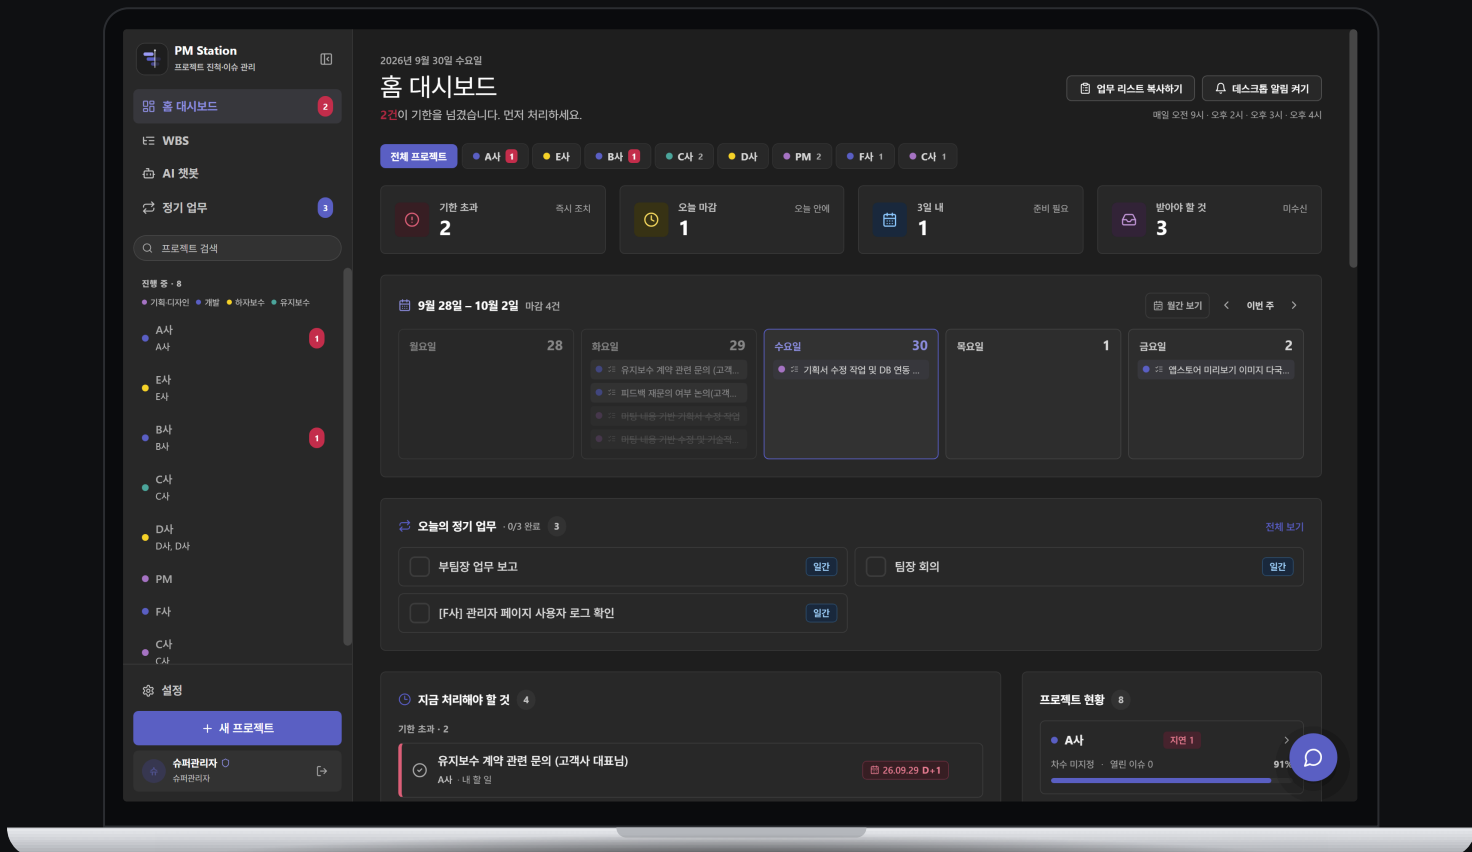

홈 대시보드 — 실제 운영 중인 화면입니다. 기한 초과·오늘 마감·3일 내·받아야 할 것으로 자동 분류되고, 고객사명은 A사·B사로 치환했습니다.

4곳 → 1곳

업무 확인 경로
메신저·엑셀·메모·문서

매일 08:10

운영 보고서 자동 발행
지표 12개·조치 필요·PDF

20분 → 1분

회의록 1건 작성 (15~20분 → 1분 내외)
녹음·텍스트로 초안 자동 생성

ROLE

기획·설계·검증·운영
(구현은 AI 개발 도구 활용)

PERIOD

2026.08 — 운영 중

STACK

React·Supabase·Vercel
OpenAI·Microsoft Teams

■ 문제

- 매뉴얼을 문서로 쌓아도 필요한 순간에 **아무도 열어보지 않음**
- 마감 · 고객사 회신 대기가 메신저 · 엑셀 · 개인 메모에 흩어져 **누락 위험**
- 운영 지표는 매일 아침 관리자 페이지를 눌러 확인한 뒤 **구두로 보고**
- 회의록은 매번 직접 정리 — **1건에 15~20분**

■ 해결

PM 업무 전체를 한 서비스로 재설계, **Claude Code로 직접 구축**

- **업무 관리** — 마감 항목을 기한 초과 · 오늘 · 3일 내 · 받아야 할 것으로 자동 분류, WBS 일정 관리
- **알림** — 설정한 시각마다 담당 업무를 서버가 Teams로 자동 발송
- **정기 업무** — 일 · 주 · 월 주기 업무의 연속 달성 · 누락 추적
- **보고 자동화** — 어드민 데이터를 읽어 매일 운영 보고서 · PDF 자동 발행
- **AI 회의록** — 논의 · 결정 · 후속 조치 · 확인 필요로 정리, 원문 키워드 검색
- **문서 챗봇** — 매뉴얼 질문에 근거 문서와 함께 답변
- **변경 이력** — 등록 · 변경 · 삭제를 DB 트리거로 자동 기록
- **계정 · 권한** — 가입 승인 · 프로젝트 참여 신청, 담당 프로젝트만 노출

■ 성과

- **지표 보고 매일 약 30분 → 0분** — 매일 08:10 자동 발행, 월 약 10시간 절감
- **회의록 작성 15~20분 → 1분 내외** — 녹음 · 텍스트를 넣으면 초안 완성
- **업무 확인 경로 4곳 → 1곳** — 병행 프로젝트 8건을 한 화면에서
- **알림 시각 복수 선택** — 원하는 시각을 골라 두면 그 시각마다 담당 업무 자동 발송
- **매뉴얼 조회 건당 5~10분 → 1분 이내** — 찾아 읽지 않고 질문

PM Station
프로젝트 진척·이슈 관리

홈 대시보드 2

WBS

AI 챗봇

정기 업무 3

프로젝트 검색

진행 중 · 8

- 기회 디자인
- 개발
- 마케팅
- 유지보수

- A사 1
- E사
- B사 1
- C사 2
- D사
- PM 2
- F사 1
- C사 1

설정

+ 새 프로젝트

슈퍼관리자

슈퍼관리자

2026년 9월 30일 수요일

홈 대시보드

2건이 기한을 넘겼습니다. 먼저 처리하세요.

매일 오전 9시 · 오후 2시 · 오후 3시 · 오후 4시

전체 프로젝트

- A사 1
- E사
- B사 1
- C사 2
- D사
- PM 2
- F사 1
- C사 1

기한 초과 2 즉시 조치

오늘 마감 1 오늘 안에

3일 내 1 준비 필요

받아야 할 것 3 미수신

9월 28일 - 10월 2일 마감 4건

월요일 28

화요일 29

수요일 30

목요일 1

금요일 2

오늘의 정기 업무 0/3 완료 3

부팅장 업무 보고 일간

팀장 회의 일간

[F사] 관리자 페이지 사용자 로그 확인 일간

지금 처리해야 할 것 4

기한 초과 · 2

유지보수 계약 관련 문의 (고객사 대표님)

A사 · 내 할 일

26.09.29 D+1

프로젝트 현황 8

A사 지연 1

자주 미지정 · 열린 이슈 0

91%

전체 화면 — **홈 대시보드** — 왼쪽에 진행 중인 프로젝트 8건, 가운데에 이번 주 마감과 오늘의 정기 업무, 아래에 지금 처리해야 할 항목이 놓입니다. 고객사명은 A사 · B사로 치환했습니다.

2026년 9월 30일 수요일

홈 대시보드

2건이 기한을 넘겼습니다. 먼저 처리하세요.

매일 오전 9시 · 오후 2시 · 오후 3시 · 오후 4시

전체 프로젝트

- A사 1
- E사
- B사 1
- C사 2
- D사
- PM 2
- F사 1
- C사 1

기한 초과 2 즉시 조치

오늘 마감 1 오늘 안에

3일 내 1 준비 필요

받아야 할 것 3 미수신

확대 — **네 갈래 분류와 알림 시각** — 마감이 있는 항목은 **기한 초과** · **오늘 마감** · **3일 내** · **받아야 할 것**으로 자동 분류됩니다. 오른쪽 위 버튼 아래의 "매일 오전 9시 · 오후 2시 · 오후 3시 · 오후 4시"가 Teams로 알림이 나가는 시작입니다.

- **받아야 할 것** — 내 할 일이 아니라 고객사 회신 · 자료를 기다리는 항목을 별도 갈래로 분리
- **오늘의 정기 업무** — 일 · 주 · 월 주기 업무를 대시보드에서 바로 체크, 연속 달성 · 누락 추적

PM Station

프로젝트 진척 이슈 관리

홈 대시보드

WBS

AI 챗봇

정기 업무

프로젝트 검색

진행 중 · 8

기획 디자인

개발

유지보수

유지보수

A사

A사

E사

E사

B사

B사

C사

C사

D사

D사, D사

PM

F사

C사

C사

설정

+ 새 프로젝트

슈퍼관리자

슈퍼관리자

WBS

프로젝트 → 차수 → 작업으로 쪼개 누가 언제 무엇을 끝내는지 봅니다. 상위 진척률은 하위 작업에서 기간만큼 가중해 굴러 올립니다.

엑셀 내보내기

전체 진척률

87%

지연

0건

7일 내 마감

3건

마일스톤

0건

일정 미정

6건

전체 프로젝트

전체 담당

지연만

종료 포함

1단

2단

전체

일정 막대

Q

Q

WBS	작업명	담당	시작일	종료일	기간	진척률	상태	2026년 10월			
								28	1	5	12
1	▼ A사	홍길동	2026.07.30	2026.09.29	62	91	진행중				
1.1	▼ (자수 미지정)		2026.08.26	2026.09.29	35	91	진행중				
1.1.1	QA 이후 오류 사항 수정 완료 시, 고객사...	홍길동, 우동...	2026.08.26	2026.08.26	1	100	완료				
1.1.2	TC 와 같이 1차 납품 진행할 것		2026.08.26	2026.08.26	1	100	완료				
1.1.3	납품드리면서 잔금 같이 요청 -> 캘린더 ...		2026.08.26	2026.08.26	1	100	완료				
1.1.4	1차 납품물에 대한 견수 진척도 문의		2026.08.31	2026.08.31	1	100	완료				
1.1.5	(09:00) 고객사 측 수정 요청 사항 및 수...		2026.09.03	2026.09.03	1	100	완료				
1.1.6	완수제(개발 완료 보고서) 작성 후 고객...		2026.09.07	2026.09.07	1	100	완료				
1.1.7	추가 수정 요청 사항 관련 이미지 수신 후...		2026.09.07	2026.09.07	1	100	완료				
1.1.8	예산 관련 기능에 대해 내부 논의 및 수정...		2026.09.22	2026.09.22	1	100	완료				
1.1.9	유지보수 계약 관련 문의 (W.대표님)		2026.09.29	2026.09.29	1	0	진행중				
1.1.10	(납품 후) 개발 견수 확인서 수신 대기중					100	완료				
1.1.11	(납품 후) 소프트웨어 개발 잔금					100	완료				
2	▼ E사	홍길동	2026.07.15	2026.09.22	70	100	완료				
2.1	▼ (자수 미지정)		2026.08.26	2026.09.22	28	100	완료				
2.1.1	동기화 및 저장으로 버튼 수정 후 버튼 클...		2026.08.26	2026.08.26	1	100	완료				
2.1.2	문의 사항에 대한 답변 수신 시, 해당 부...		2026.08.27	2026.08.27	1	100	완료				

전체 화면 — **WBS · 간트** — 프로젝트 → 차수 → 작업으로 쪼개고, 상위 진척률은 하위 작업에서 기간만큼 가중해 굴러 올립니다. 전체 진척률 · 지연 · 7일 내 마감 · 마일스톤 · 일정 미정을 상단에 두어, 여러 프로젝트의 일정 충돌을 먼저 보게 했습니다.

내 할 일 1

내가 직접 처리할 일

유지보수 계약 관련 문의 (W.대표님)

26.09.29 D-DAY

+ 빠른 추가 후 Enter

후속조치 0

이슈에 대한 조치 확인

+ 빠른 추가 후 Enter

받아야 할 것 0

고객사 팀에서 받아야 할 자료

+ 빠른 추가 후 Enter

확대 — **프로젝트 상세의 세 레인** — 할 일을 내가 직접 처리할 일 / 이슈에 대한 후속조치 / 고객사 · 팀에서 받아야 할 자료로 분리했습니다. "받아야 할 것"을 별도 레인으로 세워 두지 않으면 대기 중인 건이 반드시 새기 때문입니다.

WBS는 **엑셀로 내보내** 고객사 보고에 그대로 쓰고, 여기서 관리하는 할 일과 이슈는 마감일이 있으면 자동으로 알림 대상에 편입됩니다. 일정표와 알림이 다른 문서에 있으면 둘 중 하나는 반드시 낡기 때문에, 같은 데이터를 두 화면으로 보여주는 구조로 잡았습니다.

워크플로 어제 오후 2:00

PM Station · 09/29 (화)
지연 0 · 오늘 2 · 임박 1 · 정기 업무 1

[A사]

- (D-DAY) 유지보수 계약 범위 확인 (고객사 담당자) · 할 일

[B사]

- (D-DAY) 2차 피드백 반영 여부 회신 · 할 일

[C사]

- (D-3) 관리자 대시보드 시안 공유 · 할 일

[정기 업무]

- (주간) 프로젝트 기본 정보 업데이트

워크플로 어제 오후 4:00

PM Station · 09/29 (화)
지연 0 · 오늘 1 · 임박 1 · 정기 업무 1

[B사]

- (D-DAY) 2차 피드백 반영 여부 회신 · 할 일

[C사]

- (D-3) 관리자 대시보드 시안 공유 · 할 일


[정기 업무]

- (주간) 프로젝트 기본 정보 업데이트


수신 — **Teams 개인 채팅** — 설정한 시각마다 담당 프로젝트별 업무가 지연 · 오늘 · 임박 · 정기 업무 순으로 도착. 이미 끝낸 일은 다음 알림에서 빠짐 (내용은 가상 예시)

동작 흐름

01	02	03	04	05
알림 시각 복수 선택	서버 스케줄러가 시각마다 실행	담당 프로젝트의 미완료 업무 집계	Teams 개인 채팅 으로 발송	끝낸 일은 다음 알림에서 제외




설정 — **알림 시각 복수 선택** — 원하는 시각을 여러 개
고르면 브라우저 · Teams 알림에 함께 적용



연동 — **채널 주소 등록** — 한 번 등록하면 서버가 보내므로
앱을 꺼 뒀도 도착

- **원하는 시각을 복수로 선택** — 설정한 시각마다
자동 발송
- **담당 프로젝트 업무만** — 참여 승인된 프로젝트
기준으로 범위를 나눔
- **열지 않아도 도착** — 대시보드는 열어야
보이지만, 알림은 사람이 있는 곳으로 감

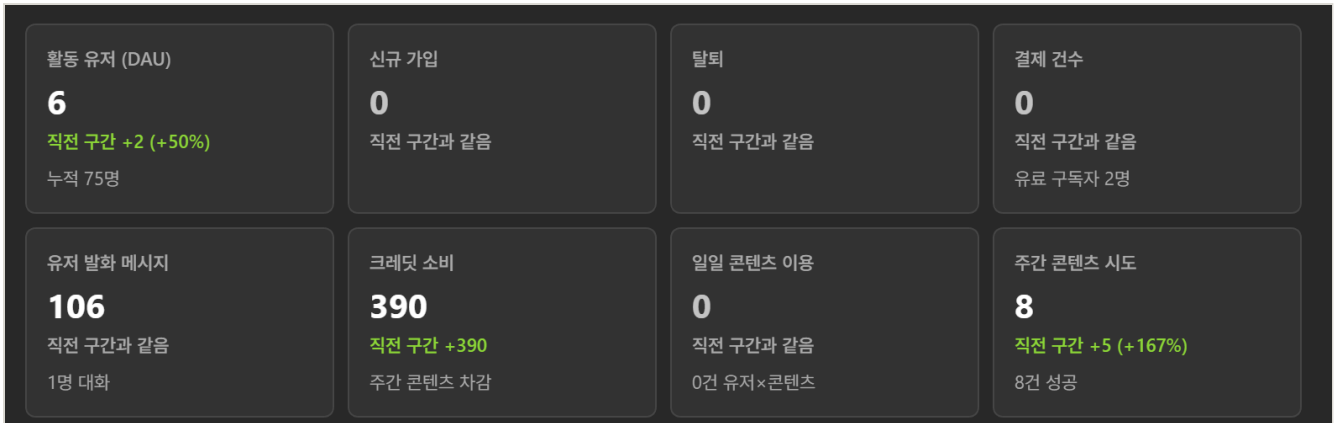

지표 — **지표 12개와 증감** — 직전 보고서 이후 구간을 같은 길이의 직전 구간과 비교해 증감을 함께 표시

8. 조치 필요

- 미답변 문의 2건 — 유저 A (user_a)(오류), 유저 B (user_b)(기타). 오늘 중 답변.
- 탈퇴 1명. 이용 기간 59일.

9. 인사이트

- 크레딧 소비 급증 → 해석: 전체 크레딧 사용량 1,650은 한 유료 이용자(유저 B)의 주간 콘텐츠(여러 건의 유료 이미지비디오) 결제에 기인한다(결제 기록에 셀렉트A std 구독과 weekly rows의 multiple charged 항목 함께와 일치). 다음 행동: 해당 이용자 결제 콘텐츠 로그(시간대별 charged 항목, 전역 크레딧 1,450 확인)를 바탕으로 유료 콘텐츠 패키지 구성이나 변동 할인 제안을 준비하라.
- 유저 A의 과도한 발화 집중 → 해석: 한 사용자(유저 A)가 발화 719건 누적 total 9,566건 streak 63일로 전체 메시지의 대부분을 차지한다. 한 명의 행동이 전체 지표를 왜곡하고 있으며 운영 콘텐츠 부담(응답 생성 비용) 가능성이 있다. 다음 행동: 해당 계정의 이용 패턴(몇 여부, API 오류, 콘텐츠 품질 피드백)을 확인하고 필요 시 이용 한도 설정 또는 파워유저 전용 가이드 유료 전환 제안을 검토하라.
- 차단 건수 감소(3→0) · 문의 증가(0→2) → 해석: 직전 구간에 있었던 차단 이슈는 이번 구간에 해결된 것으로 보이나 고객 문의가 2건(유저 A, 유저 B)으로 접수되어 정성적 문제(생성물 품질, 삭제-재생성 UX)가 남아있다. 다음 행동: 두 건에 우선 답변 후 이미지 재생성/삭제 기능의 가이드라인 및 자체 체크리스트(업로드된 사용자 사진 처리 로직, 재생성 옵션) 개선안을 기획하라.

▲ 일부 데이터 수집 실패

- 일일 콘텐츠 상세 /api/ing/daily 조회 실패 (HTTP 500) — 이 세션은 0으로 표시됨. 에드민 API 변경 여부 확인 필요.
- 일일 콘텐츠는 이후 항목으로 대체 함게 — 이 구간에 처음 온 콘텐츠는 횟수가 정확하고, 전부터 쓰던 콘텐츠는 1회로만 셈 — 이 세션은 0으로 표시됨. 에드민 API 변경 여부 확인 필요.


기준: 2026년 9월 22일 (목) 08:10 — 2026년 9월 28일 (목) 08:10 KST. 테스트 계정 제외. 휴강은 바로 앞의 끝은 같이 구간(2026년 9월 16일 (수) 08:10 — 2026년 9월 22일 (목) 08:10)과 비교. 발화 = 유저가 보낸 메시지, 응답 = F사기 입한 메시지(응답 발송 제외). 발화-이용-시도는 유저별 로그를 한 단위로 세었고, 누락은 그 대역명에서 지금까지 오간 발화+응답 관계(에드민 22), 연속입은 유저가 발한 날이 이어진 일수. 크레딧 소비는 주간 콘텐츠 차감만만 집계.

장애 내성 — **일부 수집 실패 표시** — 에드민 API 한 곳이 실패해도 보고서는 멈추지 않고 빈 항목과 확인할 곳을 명시

조치 · 인사이트 — **오늘 할 일과 해석** — 당일 처리할 항목을 먼저 띄우고, 지표마다


"해석 → 다음 행동"을 붙임

- 매일 08:10 자동 발행 — 서버가 에드민 데이터를 읽어 보고서와 PDF를 만들어 기록 탭에 쌓음
- 지표 → 요약 → 상세 → 조치 필요 → 인사이트 → 집계 기준 순서로 한 건에 정리
- 매일 약 30분 → 0분 — 관리자 페이지 확인 · 구두 보고 준비가 사라지고 확인과 판단만 남음
- 사용자 이름 · 아이디는 유저 A~K, 서비스명은 F사로 치환해 촬영

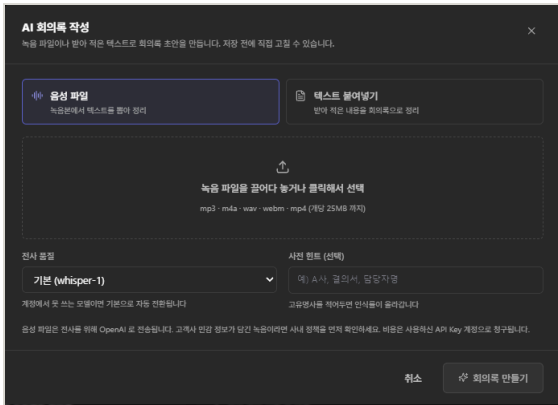

입력 — 녹음 파일 또는 텍스트 — mp3 · m4a · wav 등
녹음본이나 받아 적은 메모 · 문서를 그대로 넣음

- 결과는 논의 내용 · 결정 사항 · 후속 조치 · 확인 필요로 나누어 작성
- 원문을 함께 저장하고, 원문 안에서 키워드 검색 → 해당 줄로 바로 이동
- 녹취에 없는 내용은 쓰지 않도록 규칙화 — 초안과 원문을 대조해 확인
- 회의록 작성 15~20분 → 1분 내외 (예시는 가상의 회의 내용으로 생성)

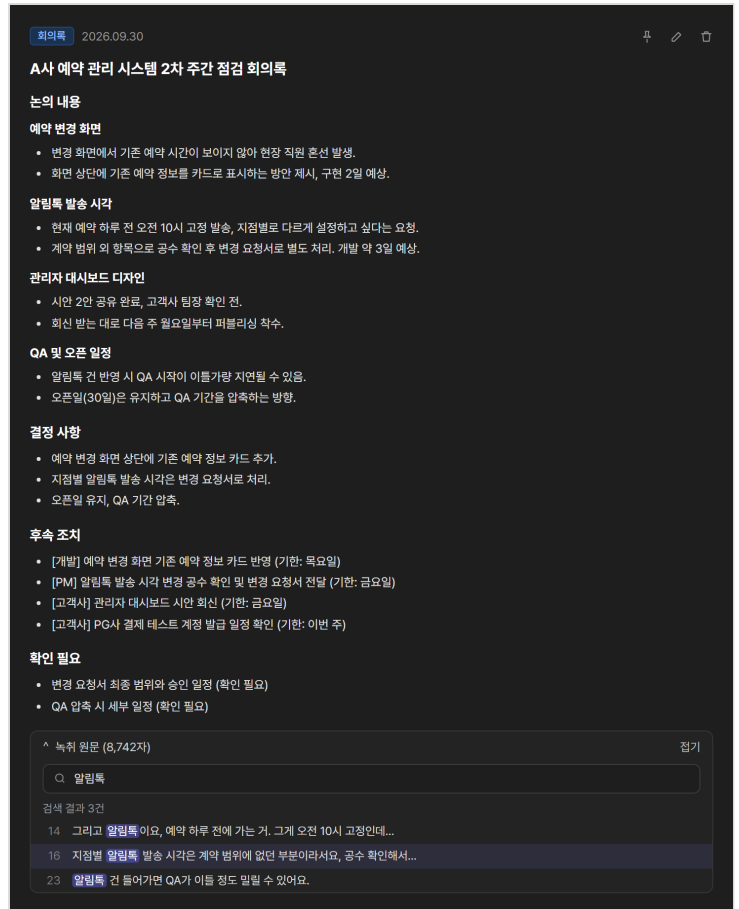

결과 — 생성된 회의록 — 논의 내용 · 결정 사항 · 후속 조치 · 확인 필요로 구분,
아래에 원문과 키워드 검색 (내용은 가상 예시)

동작 흐름

01

녹음 파일 또는
텍스트 · 문서 입력

02

음성은 전사
(Whisper)

03

논의 · 결정 · 후속 조치
· 확인 필요로 정리

04

저장 전
직접 수정

05

원문 보관 ·
키워드 검색

PM Station

프로젝트 진척 이슈 관리

홈 대시보드

WBS

AI 챗봇

정기 업무

프로젝트 검색

진행 중 · 8

기획 디자인

개발

하자보수

유지보수

A사

A사

E사

E사

B사

B사

C사

C사

D사

D사, D사

PM

F사

C사

C사

설정

+ 새 프로젝트

슈퍼관리자

슈퍼관리자

새 대화

대화 검색

오늘

안녕

안녕

gpt-5-mini · 학습 데이터 기반 답변

6) 저작권-문구

저작권 표기 예시(Apple): ex) © 2025 CompanyName All rights reserved.

7) 인앱 결제(IAP) 관련

통신판매업 신고 번호(요청)

인앱결제(IAP)는 구매안전서비스(에스크로) 대상이 아님(안내 필요)

Apple: 인앱상품은 "인앱 상품 등록 → 인앱상품 심사 제출"을 별도로 진행해야 함(인앱상품 심사 제출 후 앱 심사 제출)

8) 개인정보-제3자 데이터 전송 관련 고지-등의

제3자(예: 외부 AI 서비스)로 사용자 데이터 전송 시

어떤 데이터가 전송되는지, 누구에게 전송되는지 명확히 분리 고지

사용자 동의 절차(약관면으로는 부족하므로 별도 동의 필요)

(앱 심사 시 미비할 경우 리젝 사유가 됨)

9) 기능별 추가 요청 항목 (해당 시)

도메인: 고객사 도메인 보유 여부(없을 경우 도메인 구매 여부-연락처/조직 정보 필요)

지도/좌표 기능: 카카오디벨로퍼스 계정 정보 요청(PM이 앱 생성-설정 후 REST API Key 전달 예정)

고객지원 URL: 지원 페이지(예: https://{service url}/support) 주소 확인(심사 시 유효성 문제로 리젝 발생 가능)

추가 안내

위 항목 중 고객사에서 직접 Play Console / App Store Connect에 입력제출해야 하는 항목이 있으니(특히 설명 카테고 리-연락처-콘텐츠 등급-인앱상품 등) 제출 권한 보유자 정보를 함께 요청해 주세요.

앱의 주요 기능(결제, SNS 로그인 전용, 지도/위치, 외부 AI 연동 등)을 알려주시면 해당 기능별로 필요한 추가 자료(예: 통신판매업 신고증, 테스트 시나리오, API 키 전달 방식 등)를 포함해 체크리스트를 작성해 드리겠습니다.

근거: 내부 매뉴얼(앱 개발 시 내부 준비사항 · 앱 심사 시 필요 정보 · 테스트 계정, 인앱결제-저작권-카카오맵 매뉴얼 등).

근거

앱 개발 시 내부 준비사항 - 프로젝트 관리 매뉴얼 2df126e

세금계산서 발행 요청 양식 매뉴얼 319126e22615803ba

카카오맵 위치 좌표 기능 설정 및 REST API Key 전달 매뉴

개발 필요 정보 기본 항목 2fd126e2261580b7913ec787

앱 심사 거절 사유 및 해결방안 모음 31a126e2261580d5

Apple Developer 개인 계정을 조직 계정으로 전환하는 방

고객사 개인 연락 및 추가 요청 대응 매뉴얼 2f0126e2261

고객사 수정 요청 사항 개별 전달 이슈 대응 가이드 35a126

기획 PM 업무 매뉴얼 2d5126e22615804f8cc8ea634b

기획 PM 업무 매뉴얼 2d5126e22615804f8cc8ea634b

이어서 질문하세요 (Shift+Enter 줄바꿈)

등록된 학습 데이터에서 관련 내용을 찾아 드립니다. 자료에 없는 내용은 답하지 않습니다.

전체 화면 — **AI 챗봇** — 매뉴얼화한 사내 문서를 학습 데이터로 올려, 앱 심사 준비물이나 세금계산서 양식 같은 질문에 항목별로 정리해 답합니다. 과도기에 Claude AI의 'PM' 프로젝트로 쓰던 문서 검색 방식을 시스템 안의 기능으로 흡수한 부분입니다.

근거: 내부 매뉴얼(앱 개발 시 내부 준비사항 · 앱 심사 시 필요 정보 · 테스트 계정, 인앱결제-저작권-카카오맵 매뉴얼 등).

근거

앱 개발 시 내부 준비사항 - 프로젝트 관리 매뉴얼 2df126e

세금계산서 발행 요청 양식 매뉴얼 319126e22615803ba

카카오맵 위치 좌표 기능 설정 및 REST API Key 전달 매뉴

개발 필요 정보 기본 항목 2fd126e2261580b7913ec787

앱 심사 거절 사유 및 해결방안 모음 31a126e2261580d5

Apple Developer 개인 계정을 조직 계정으로 전환하는 방

고객사 개인 연락 및 추가 요청 대응 매뉴얼 2f0126e2261

고객사 수정 요청 사항 개별 전달 이슈 대응 가이드 35a126

기획 PM 업무 매뉴얼 2d5126e22615804f8cc8ea634b

기획 PM 업무 매뉴얼 2d5126e22615804f8cc8ea634b

확대 — **근거 문서 표시** — 답변 아래에 어느 매뉴얼에서 나온 내용인지 근거 문서를 붙여 보여줍니다. 화면 맨 아래 안내처럼 등록된 학습 데이터에 없는 내용은 답하지 않도록 제한해, 업무에 쓸 수 없는 그럴듯한 답을 막았습니다.

PM STATION

10

전체 화면 — **변경 이력** — 등록 · 변경 · 삭제가 DB 트리거로 자동 기록됩니다. 어떤 할 일의 진척률이 언제 0에서 100으로 바뀌었는지까지 남아, "그때 일정이 왜 바뀌었죠?"에 근거로 답할 수 있습니다. 차수 · 이슈 · 할 일 · 기록 · 프로젝트별로 걸러 봅니다.


확대 — **변경 목록** — 항목마다 무엇이 어떤 값에서 어떤 값으로 바뀌었는지(예: progress 0 → 100)와 시각이 남습니다. 오른쪽 위에서 차수 · 이슈 · 할 일 · 기록 · 프로젝트별로 거를 수 있습니다.

■ 무엇이 남는가

- **누가 · 언제 · 무엇을** — 할 일 · 이슈 · 차수 · 기록 · 프로젝트의 등록 · 변경 · 삭제가 사람이 따로 적지 않아도 남습니다.
- **바뀌기 전과 후** — 진척률 · 기한 · 담당자처럼 바뀐 항목은 이전 값과 이후 값을 함께 보여 줍니다.
- **보고의 근거** — 일정이 밀린 이유를 기억이 아니라 기록으로 설명할 수 있고, 고객사와 범위를 다룰 때도 근거가 됩니다.

02 PRD Toolkit

계약서 PDF 한 건을 넣으면 기능 정의부터 **클릭이 되는 HTML 시안** · **화면별 기획서** · **테스트케이스**까지 한 번에 만들어 링크로 전달합니다.

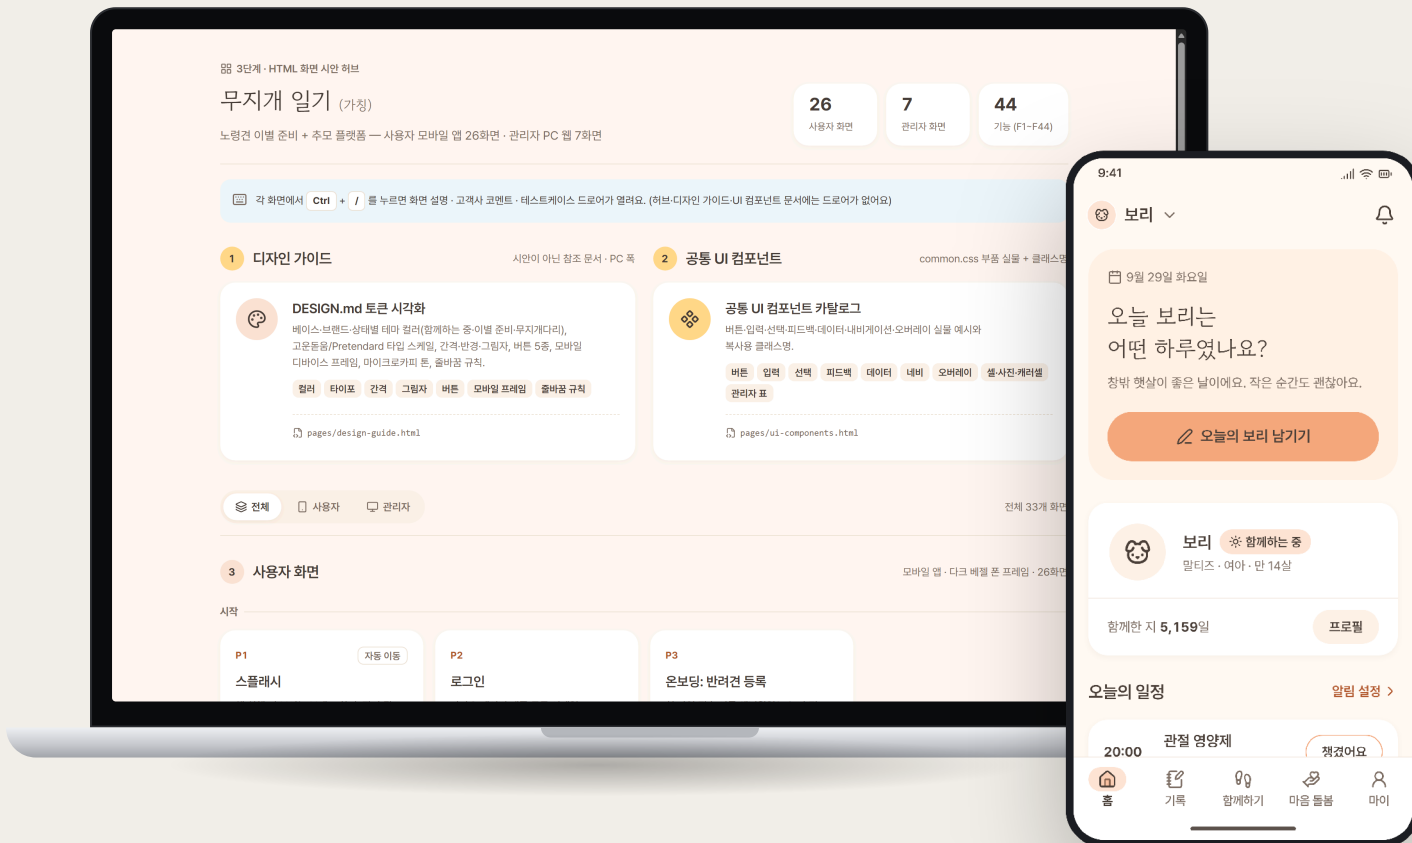

시안 허브 · 사용자 화면 — 가상 예시 프로젝트 「무지개 일기」로 생성한 결과물입니다. 전체 화면과 화면별 기획서는 ramseok.github.io/prd-demo 에서 볼 수 있습니다.

4종 → 1곳

기획서 · 디자인/컴포넌트 가이드
고객 피드백 · 테스트케이스를 한 링크에서

직접 클릭 검토

고객사가 기획서를 펼친 채 화면을 직접 눌러 확인
만족도 상승 · 조율 시간 대폭 단축

HTML · CSS 인계

실제 마크업이 있는 상태로
개발 착수 — 구현이 쉬워짐

ROLE

설계 · 구축 · 운영

PERIOD

2026.06 — 운영 중

STACK

Claude Code · 에이전트 9종
Supabase · Netlify · Vercel

■ 이 장의 화면에 대하여

실제 고객사 프로젝트의 기획서는 비밀유지 대상이라 첨부할 수 없습니다. 이어지는 산출물은 모두 **가상의 예시 프로젝트 '무지개 일기(가칭)'**를 **파이프라인에 넣어 생성한 결과물**입니다. 도구의 동작과 결과물 형태를 보여주기 위한 것이며, 특정 고객사의 내용이 아닙니다. 전체 산출물은 ramseok.github.io/prd-demo 에서 직접 열어볼 수 있습니다. 화면 확인용으로 정적 HTML만 공개한 것이라 **실제 서버 배포와 DB 연동은 되어 있지 않습니다.**

■ 문제

- Figma로 화면을 한 장씩 그려 **초안까지 1~2주**
- 기획서 · 디자인 가이드 · 고객 피드백 · 테스트케이스가 **서로 다른 문서로 파편화**
- 피드백이 어느 화면 · 어느 항목 얘기인지 **매번 다시 대조**

■ 해결

계약서 PDF를 **출발점**으로 기능 정의 → 페이지 맵 → HTML 시안 → 화면별 기획서 · 테스트케이스까지 한 번에 생성

- 동작하는 **HTML 시안** — 버튼 클릭 · 페이지 이동이 실제로 되는 화면
- 리뷰 레이어 — **Ctrl + /** 로 화면별 기획서 · 고객 코멘트 · 테스트케이스를 한 패널에
- 디자인 · 컴포넌트 가이드 — DESIGN.md 토큰으로 전 화면 통일
- 품질 게이트 — 생성과 검토를 분리, 내용 기준으로 완료 판정
- 링크 전달 — 자동 배포 후 링크 하나로 공유, 피드백은 DB에 기록

■ 성과

- **파편화된 문서 4종 → 링크 1개** — 기획 · 디자인 · 피드백 · 테스트를 한 곳에서 진행
- **고객사 만족도 상승** — 직접 버튼을 누르고 페이지를 이동하며 기획서와 함께 검토
- **피드백 왕복 3회 → 1회** — 화면 앞에서 바로 합의해 요구사항 조율 시간 대폭 단축
- **화면 33개 HTML · CSS 인계** — 개발팀이 실제 마크업 위에서 바로 착수
- **초안 작성 1~2주 → 30분~1시간** — 최초 산출물 기준

■ 이전 → 이후

구간	이전	지금
초안 작성	Figma로 화면을 한 장씩 작도 · 1~2주	30분~1시간 내외로 일괄 생성
고객 전달	PDF 변환 · 병합 후 첨부	자동 배포된 링크 하나
피드백	메신저 · 메일 · 별도 문서로 분산	화면에 붙어 상태로 관리
검수	테스트케이스를 별도 문서로 관리	시안 안에서 Pass · Fail 기록

01
계약서 입력**02**
기능 정의**03**
페이지 맵**04**
HTML 시안**05**
기획서 · TC**06**
링크 배포**전체 기획서 바로 보기 — 가상 예시 프로젝트 '무지개 일기(가칭)',**시안 허브 · 화면별 기획서 ramseok.github.io/prd-demo

아래는 위 흐름의 04~05단계 산출물입니다. 가상의 프로젝트라 **실제 서버 배포와 DB 연동은 되어 있지 않아** 로그인 · 저장 같은 기능은 동작하지 않고, 코멘트 · 테스트케이스 결과는 보고 있는 브라우저에만 임시로 남습니다. 시안 화면에서 **Ctrl + /** 를 누르면 그 화면의 기획서가 열립니다.

3단계 · HTML 화면 시안 허브

무지개 일기 (가칭)

26

사용자 화면

7

관리자 화면

44

기능 (F1~F44)

노령견 이별 준비 + 추모 플랫폼 — 사용자 모바일 앱 26화면 · 관리자 PC 웹 7화면

각 화면에서 **Ctrl + /** 를 누르면 화면 설명 · 고객사 코멘트 · 테스트케이스 드로어가 열려요. (허브·디자인 가이드·UI 컴포넌트 문서에는 드로어가 없어요)

전체

사용자

관리자

전체 33개 화면 + 참조 문서 2개

1 사용자 화면

모바일 앱 · 다크 베젤 폰 프레임 · 26화면

시작

P1

자동 이동

스플래시

앱 실행 시 보이는 브랜드 화면. 잠시 뒤 로그인 또는 홈으로 이동해요.

전제

user/splash.html

P2

로그인

카카오·네이버·애플·구글·이메일 로그인. 가입·비밀번호 재설정은 화면 내 탭으로 처리해요.

F1

user/login.html

P3

온보딩: 반려견 등록

첫 가입 직후 이름·생년월일(또는 추정 나이)·사진으로 반려견을 등록해요.

F2

user/onboarding-pet.html

홈 · 반려견 상태

P4

기준 시안

상태별 홈

함께하는 중 · 이별 준비 · 무지개다리에 따라 홈 구성이 바뀌어요. 시연용 상태 스위처 포함.

F3 F6 F8 F34 F35

P5

반려견 관리

여러 마리 전환, 프로필 수정, 이별 준비 모드 전환·복귀가 이 화면에서만 이뤄져요.

F2 F4 F38

P6

무지개다리 전환

무지개다리를 건넌 날 입력과 2단계 확인, 전환 후 7일 이내 되돌리기.

F5 F6 F35

산출물 — 시안 허브 — 예시 프로젝트 한 건에서 **사용자 화면 26 · 관리자 화면 7 · 기능 44개(F1~F44)**가 생성됐습니다. 화면 카드마다 설명과 관련 기능 번호, 실제 파일 경로가 함께 붙어 **기능과 화면이 1:1로 대응**됩니다. 상단 안내처럼 모든 화면에서 **Ctrl + /** 로 리뷰 패널이 열립니다.

단계마다 역할이 다른 **전담 에이전트 9종**을 두고, 계약 해석처럼 판단이 무거운 일과 화면 양산, 기계적 검사에 각각 다른 모델을 배치해 비용과 속도를 맞췄습니다. 상위 산출물이 수정되면 하위 단계의 검토 상태가 자동으로 무효화돼 문서 간 어긋남을 막습니다.

PRD TOOLKIT · 가상 예시 프로젝트

14

9:41

← 반려견 관리

등록한 아이들의 정보를 살펴보고, 필요할 때 상태를 바꿔요.

우리 아이들 2 / 5마리

보리 ※ 함께하는 중

말티즈 · 여아 · 만 14살

2012.06.02생

♡ 함께한 지 5,159일

♡ 동물등록번호 4100*****8901

정보 수정

이별 준비로 전환

☁ 무지개다리를 건넜어요

콩이 ※ 함께하는 중

푸들 · 남아 · 만 8살

2017.10.15생

♡ 함께한 지 3,225일

페이지 안내

고객사 코멘트 0건

테스트케이스 18건

수정

Ctrl + /

×

P5 반려견 관리 (다건 등록 · 이별 준비 전환)

URL /mypage/pets · 대상 사용자 · 관련 기능 F2, F4, F8, F38

마이페이지에서 들어와 등록된 반려견 목록을 확인하고, 반려견별 프로필을 수정하거나 상태(함께하는 중/이별 준비)를 직접 전환하는 화면이다. 무지개다리 전환 자체는 이 화면이 아니라 각 카드의 "무지개다리를 건넜어요" 버튼을 통해 P6으로 넘어가서 처리한다. 새 반려견 등록도 이 화면의 바텀시트에서 이뤄지며, 무료 플랜 5마리 한도가 여기서 적용된다.

화면 구성

영역	내용	관련 기능
헤더	뒤로가기(마이페이지로) · "반려견 관리" 제목	-
안내 문구	"등록한 아이들의 정보를 살펴보고, 필요할 때 상태를 바꿔요."	-
우리 아이들	섹션 제목 우측 등록 수("N / 5마리") + 반려견 카드 목록	F2, F38
반려견 카드	상단: 아바타, 이름+상태 배지, 견종·성별·나이 한 줄과 "YYYY.MM.DD생" 한 줄, 우측 카메라(대표 사진 바꾸기) 버튼 / 정보 박스: 함께한 지 일수(또는 무지개다리 기간), 등록번호(마스킹/미등록) / 하단: 정보 수정-상태 전환 버튼 2열 + "무지개다리를 건넜어요" 버튼	F2, F4
인라인 정보 수정 폼	카드 내부에 펼쳐지는 이름·생년월일·견종·성별·입양일·등록번호 입력칸	F2
새 반려견 등록 버튼	"새로운 아이 등록하기" + "무료 플랜은 최대 5마리까지" 안내	F2, F38
상태 전환 확인 모달	이별 준비 전환/복귀 확인 팝업	F4
새 반려견 등록 바텀시트	제목 "어떤 아이를 등록할까요?", 이름*, "태어난 날짜를 골라요" 체크, 생년월일*(체크 시 추정 나이*), 견종·성별·입양일·동물등록번호(각 라벨 우측 "선택" 표시), 취소·등록하기 버튼	F2, F38
토스트	저장/전환/등록/한도초과 안내 (3초)	-


제작 정의

산출물 — **화면별 기획서** — 왼쪽은 클릭과 페이지 이동이 실제로 동작하는 시안, 오른쪽은 **Ctrl + /** 로 열리는 패널입니다. URL · 대상 · 관련 기능이 머리에 오고, 화면 구성은 **영역 · 내용 · 관련 기능** 표로 정리됩니다. 개발팀이 그대로 읽는 문서입니다.


기획서와 시안을 따로 보내면 고객사는 두 문서를 번갈아 맞춰 봐야 했습니다. 지금은 **보고 있는 화면이 곧 문서의 기준점**이라, "어느 화면의 어느 항목"을 설명하는 데 드는 대화가 사라졌습니다.

PRD TOOLKIT · 가상 예시 프로젝트


15

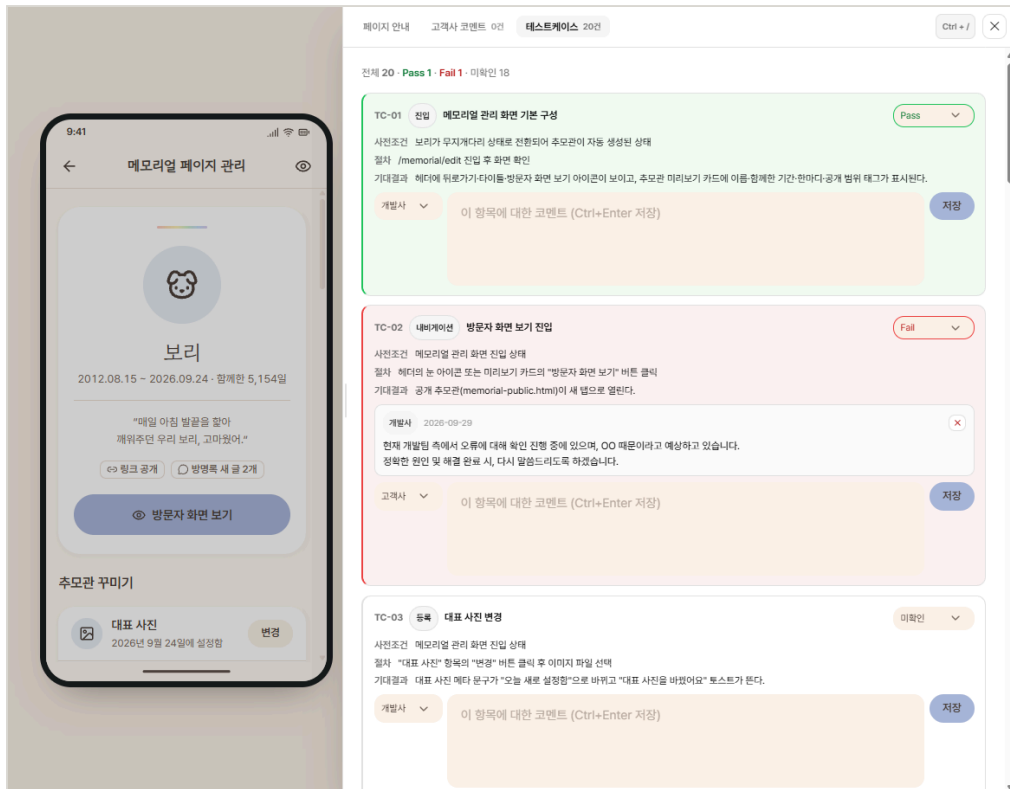

산출물 — **테스트케이스** — 사전조건 · 절차 · 기대결과가 화면 단위로 붙고 **Pass · Fail · 미확인** 상태를 그 자리에서 바꿉니다. Fail 항목에는 개발사와 고객사가 각각 코멘트를 남깁니다.

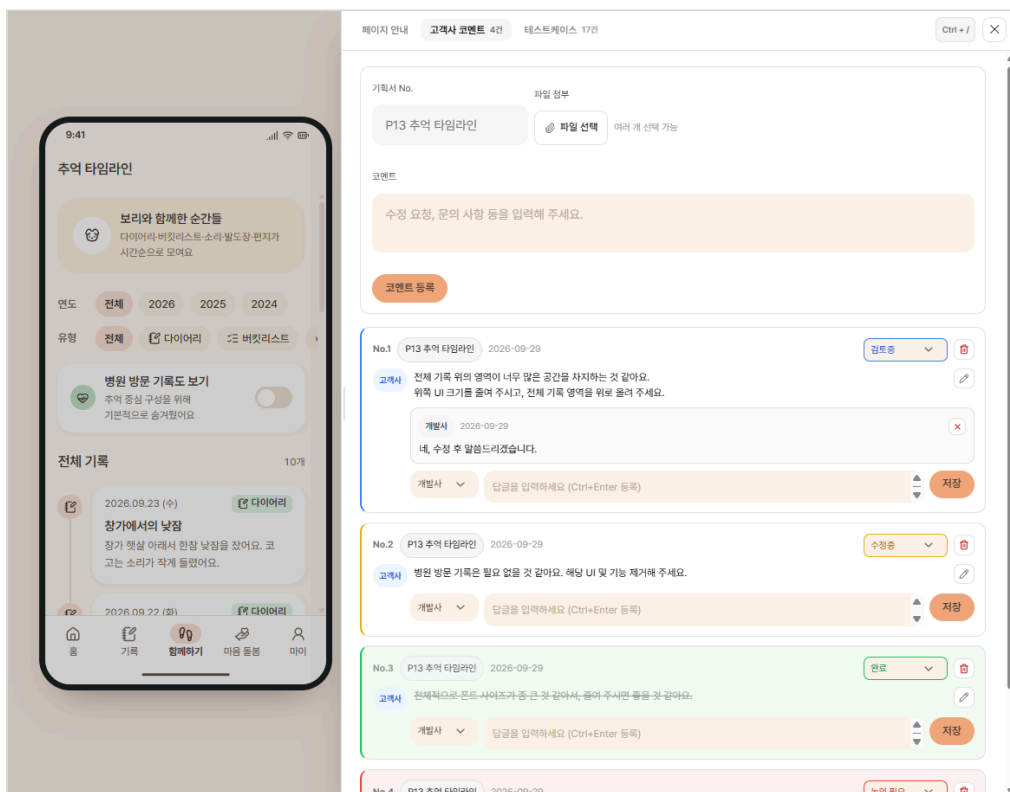

산출물 — **고객사 코멘트** — 고객사가 화면을 보면서 바로 수정 요청을 남기고 개발사가 답글을 답니다. 각 건은 **검토중 · 수정중 · 완료 · 논의 필요**로 관리되고 파일도 첨부됩니다.

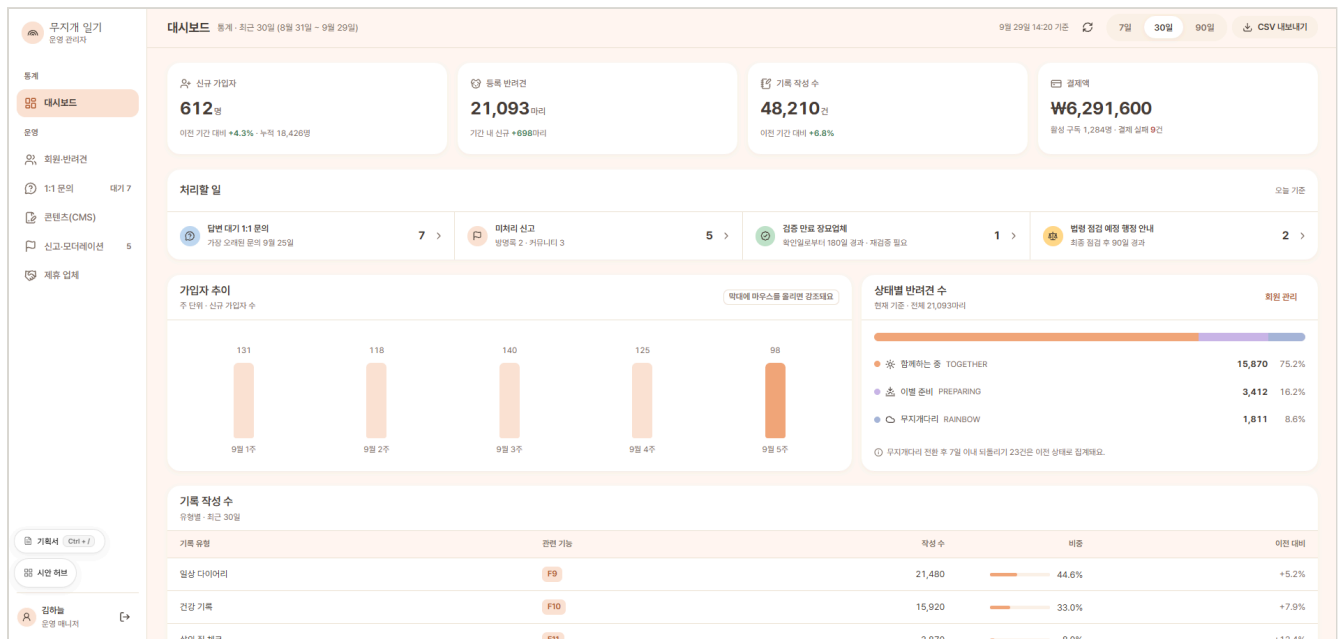

산출물 — 관리자 대시보드 시안 — 사용자 화면뿐 아니라 운영자가 보는 화면까지 생성됩니다. 지표 카드 · 처리할 일 · 추이 그래프 · 상태별 분포를 구성해 운영자가 무엇을 보고 무엇을 처리하는지를 화면으로 합의합니다. (표시된 수치는 예시값)



산출물 — 디자인 가이드 — 고객사 디자인 요구사항과 레퍼런스를 DESIGN.md의 토큰으로 정리하고, 그 값이 화면에 실제로 어떻게 적용되는지 실물로 보여주는 문서입니다. 콘셉트 · 컬러 · 타이포 · 버튼 · 접근성 · 금지 사항까지 11개 절로 고정해 **주관적 피드백으로 되돌아가는 재작업**을 줄입니다.

공수가 드는 반복 업무는 시스템이 맡고, 사람은 **사람만 할 수 있는 일**에 집중하게 만들겠습니다.

도메인이 전혀 다른 수많은 고객사의 SI 프로젝트에서 늘 **그들이 어떻게 일하는지**부터 파악해 왔습니다.
새로운 조직에서도 먼저 현업을 보고, 시간과 손이 가장 많이 드는 반복 작업부터 걷어내 **업무 효율**을
끌어올리겠습니다.

01

어떻게 일하는지
파악

02

공수가 새는
지점 발견

03

효과 순으로
우선순위

04

동작하는 도구로
자동화

05

성과를 측정해
지속 개선 · 확대 적용

Thank you.

김석남

AI 서비스 기획 · PM

ramseok.github.io · rlatjrsk1674@gmail.com
